



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020

Πορεία Υλοποίησης



2^η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

Φλώρινα, 24/10/2016



Περιεχόμενα


1. Συνοπτική Παρουσίαση ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020	3
2. Πρόοδος Υλοποίησης ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020	4
2.1 Συνολική εικόνα προόδου του Προγράμματος μέχρι 30/09/2016.....	4
2.2 Συνολική εικόνα προόδου ΕΤΠΑ μέχρι 30/09/2016.....	5
2.3 Συνολική εικόνα προόδου ΕΚΤ μέχρι 30/09/2016:	6
2.4 Πρόοδος Υλοποίησης ανά Άξονα Προτεραιότητας.....	7
3. Προβλέψεις Δαπανών – Κάλυψη Προκαταβολής / Προχρηματοδότησης 2015-2016.....	16
4. Ζητήματα που επηρεάζουν την επίδοση του προγράμματος και μέτρα που λαμβάνονται	17
4.1 Ζητήματα ανά Άξονα Προτεραιότητας (ΑΠ).....	17
4.2 Γενικά ζητήματα.....	18
5. Πρόοδος Υλοποίησης Δεικτών Εκροών και Πλαισίου Επίδοσης	19
5.1 Πρόοδος Δεικτών Εκροών.....	19
5.2 Πρόοδος Πλαισίου Επίδοσης.....	33
6. Ενημέρωση για την Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης έτους 2015 του ΕΠ ΠΔΜ 2014 - 2020.....	37




1. Συνοπτική Παρουσίαση ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020

Η Συνολική Δημόσια Δαπάνη (ΣΔΔ) του ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 ανέρχεται σε 330.737.741 € εκ της οποίας ποσό 307.243.123 € (92,9%) αφορά σε πόρους του ΕΤΠΑ, ποσό 23.494.618 € (7,1%) αφορά σε πόρους του ΕΚΤ και ποσό 66.147.554 € αφορά σε Εθνικούς πόρους.

Το ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 αποτελείται από 13 Άξονες Προτεραιότητας (ΑΠ) που περιλαμβάνουν 21 Επενδυτικές Προτεραιότητες με τη χρηματοδοτική κατανομή που παρουσιάζεται στο Σχήμα 2.

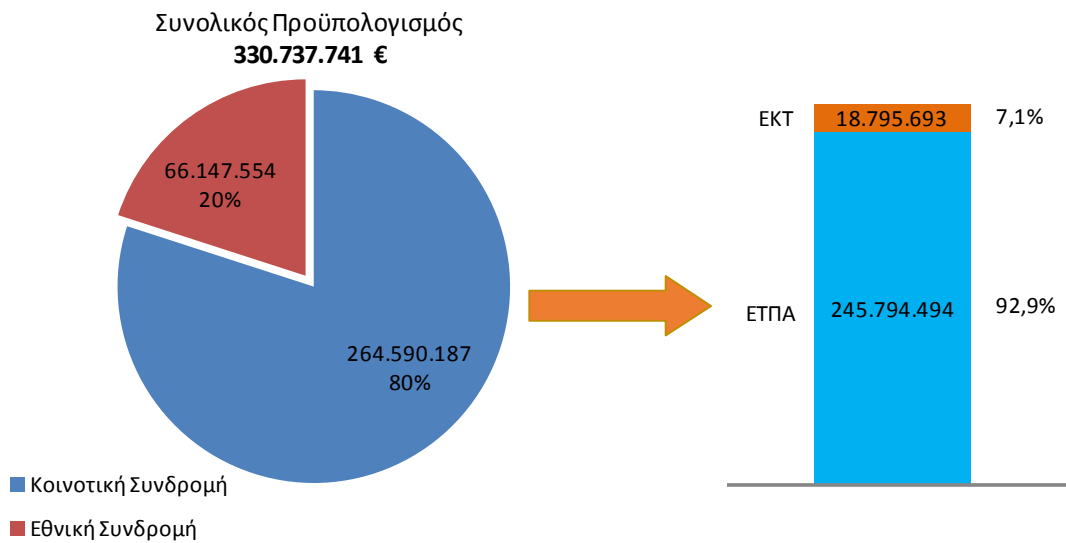

Σχήμα 1: Προϋπολογισμός ΕΠ-ΠΔΜ 2014-2020

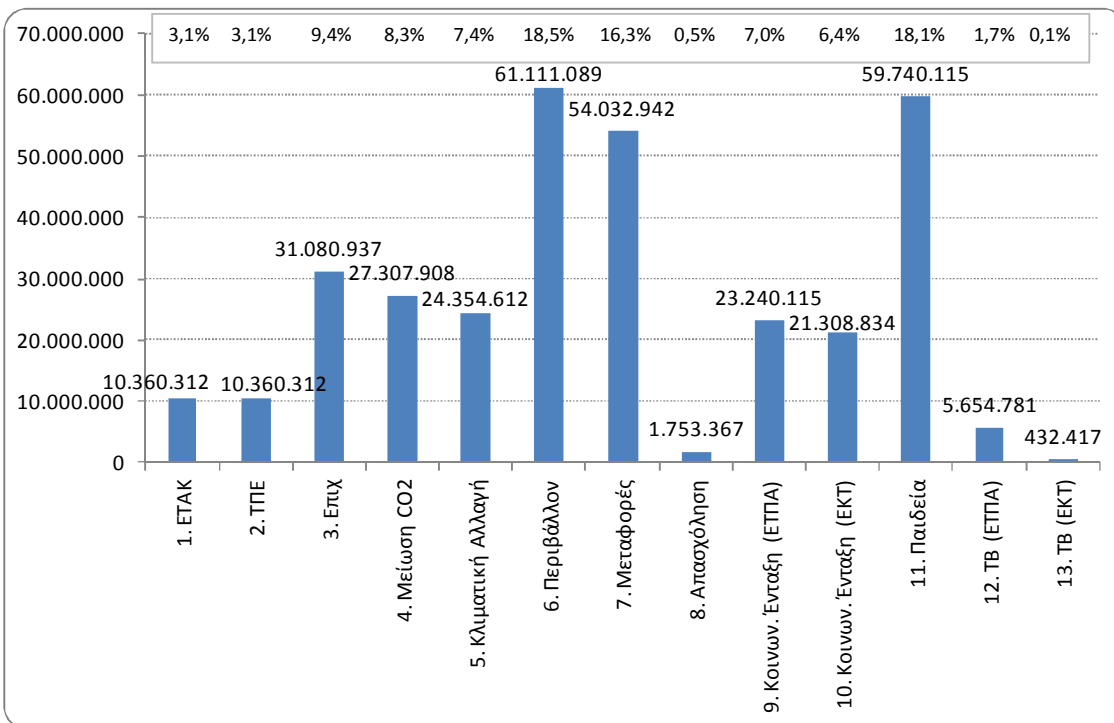


Σχήμα 2: Χρηματοδοτική Κατανομή ανά Άξονα Προτεραιότητας ΕΠ-ΠΔΜ 2014-2020



2. Πρόοδος Υλοποίησης ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020

2.1 Συνολική εικόνα προόδου του Προγράμματος μέχρι 30/09/2016

- Έχουν **εξειδικευτεί** συνολικά τριάντα δύο (32) δράσεις από το σύνολο των 65 δράσεων, σε 17 Επεν. Προτερ. από το σύνολο των 23 Επενδυτικών Προτεραιοτήτων, συνολικού ποσού 213,5 εκ. € (64,6%).
- Έχουν εκδοθεί είκοσι επτά (27) **προσκλήσεις** π/υ 128,9 εκ. € (39,0%).
- Έχουν υποβληθεί εβδομήντα τρεις (73) **προτάσεις** π/υ 163,9 εκ. € (49,5%).
- Έχουν **ενταχθεί** δέκα οκτώ (18) πράξεις π/υ 68,1 εκ. € (20,6%).
- Οι **νομικές δεσμεύσεις** ανέρχονται σε 27,7 εκ. € (8,4%).
- Οι δηλωμένες **πληρωμές** στο **ΟΠΣ** ανέρχονται σε 1.358.660 € (0,4%).

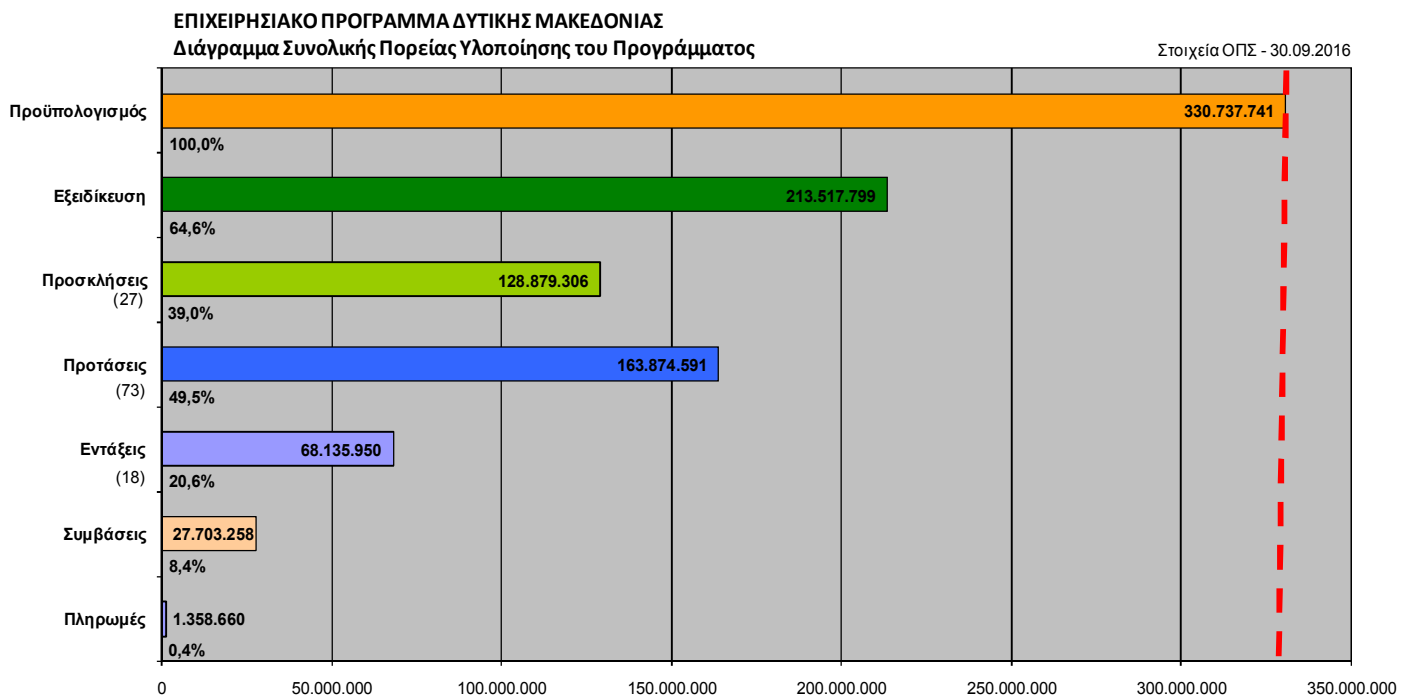

Σχήμα 3: Διάγραμμα Συνολικής Πορείας Υλοποίησης ΕΠ-ΠΔΜ 2014-2020


Προβλέψεις προόδου υλοποίησης του προγράμματος **μέχρι το τέλος του 2016:**

- Ο εκτιμώμενος π/υ **εξειδίκευσης** θα ανέρχεται σε 257,7 εκ. € (77,9%).
- Ο εκτιμώμενος π/υ **προσκλήσεων** θα ανέρχεται σε 229,5 εκ. € (69,4%).
- Ο εκτιμώμενος π/υ **εντάξεων** θα ανέρχεται σε 109,4 εκ. € (33,1%).
- Ο εκτιμώμενος π/υ των **νομικών δεσμεύσεων** θα ανέρχεται σε 51,4 εκ. € (15,5%).
- Οι εκτιμώμενες **πληρωμές** θα ανέρχονται σε 24,1 € (7,3%).



2.2 Συνολική εικόνα προόδου ΕΤΠΑ μέχρι 30/09/2016

- Έχουν **εξειδικευτεί** συνολικά είκοσι τέσσερις (**24**) **δράσεις** από το σύνολο των 40 δράσεων, σε 13 Επεν. Προτερ. από το σύνολο των 17 Επενδυτικών Προτεραιοτήτων, συνολικού ποσού 197,9 εκ. € (64,6%).
- Έχουν εκδοθεί δέκα επτά (17) **προσκλήσεις** π/υ 118,7 εκ. € (38,6%).
- Έχουν υποβληθεί πενήντα δύο (52) **προτάσεις** π/υ 154,4 εκ. € (50,3%).
- Έχουν **ενταχθεί** δέκα τέσσερις (14) πράξεις π/υ 62,3 εκ. € (20,3%).
- Οι **νομικές δεσμεύσεις** ανέρχονται σε 24,7 εκ. € (8%).
- Οι δηλωμένες **πληρωμές** στο **ΟΠΣ** ανέρχονται σε 935.795 € (0,3%).

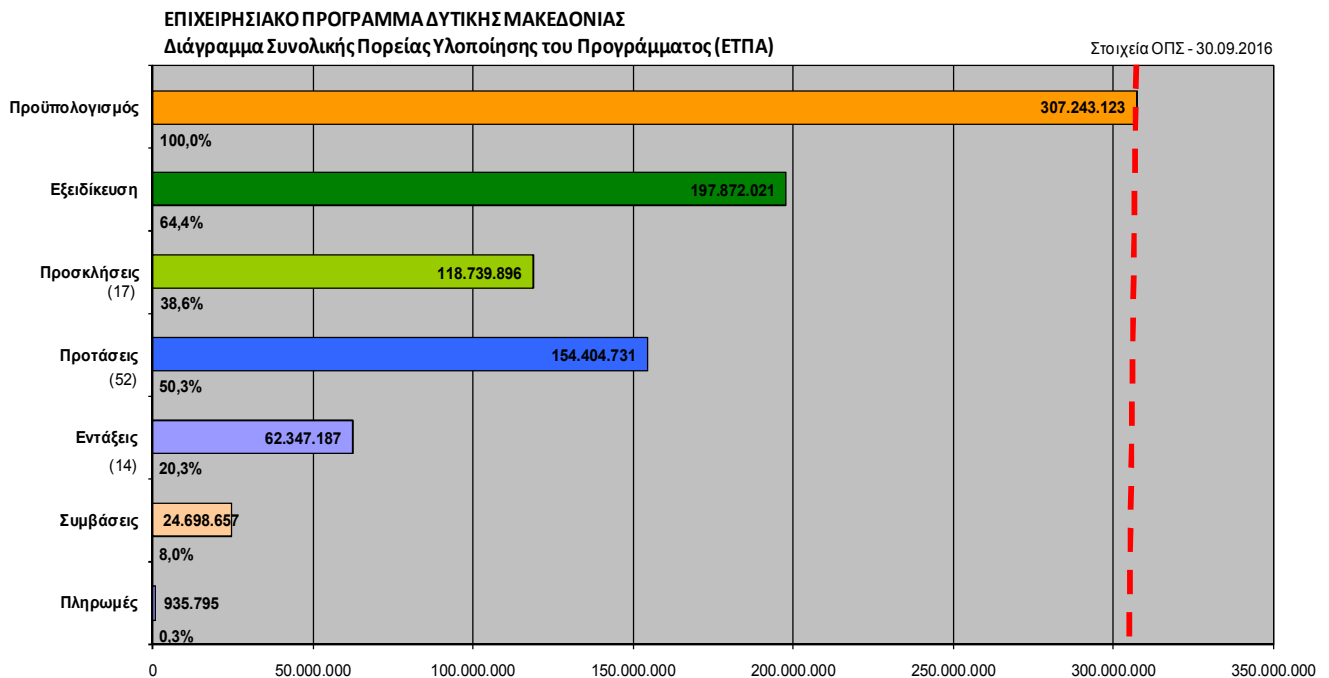

Σχήμα 4: Διάγραμμα Συνολικής Πορείας Υλοποίησης ΕΤΠΑ


Προβλέψεις προόδου υλοποίησης ΕΤΠΑ **μέχρι το τέλος του 2016:**

- Ο εκτιμώμενος π/υ **εξειδίκευσης** θα ανέρχεται σε 238,3 εκ. € (77,6%).
- Ο εκτιμώμενος π/υ **προσκλήσεων** θα ανέρχεται σε 218,7 εκ. € (71,2%).
- Ο εκτιμώμενος π/υ **εντάξεων** θα ανέρχεται σε 99,6 εκ. € (32,4%).
- Ο εκτιμώμενος π/υ των **νομικών δεσμεύσεων** θα ανέρχεται σε 45,6 εκ. € (14,8%).
- Οι εκτιμώμενες **πληρωμές** θα ανέρχονται σε 20,1 € (6,5%).



2.3 Συνολική εικόνα προόδου ΕΚΤ μέχρι 30/09/2016:

- Έχουν **εξειδικευτεί** συνολικά οκτώ (8) **δράσεις** από το σύνολο των 25 δράσεων, σε 4 Επεν. Προτερ. από το σύνολο των 6 Επενδυτικών Προτεραιοτήτων, συνολικού ποσού 15,6 εκ. € (66,7%).
- Έχουν εκδοθεί δέκα (10) **προσκλήσεις** π/υ 10,1 εκ. € (43,2%).
- Έχουν **υποβληθεί** είκοσι μία (21) **προτάσεις** π/υ 9,5 εκ. € (40,3%).
- Έχουν **ενταχθεί** τέσσερα (4) πράξεις π/υ 5,8 εκ. € (24,6%).
- Οι **νομικές δεσμεύσεις** ανέρχονται σε 3,0 εκ. € (12,8%).
- Οι δηλωμένες **πληρωμές** στο **ΟΠΣ** ανέρχονται σε 422.866 € (1,8%).

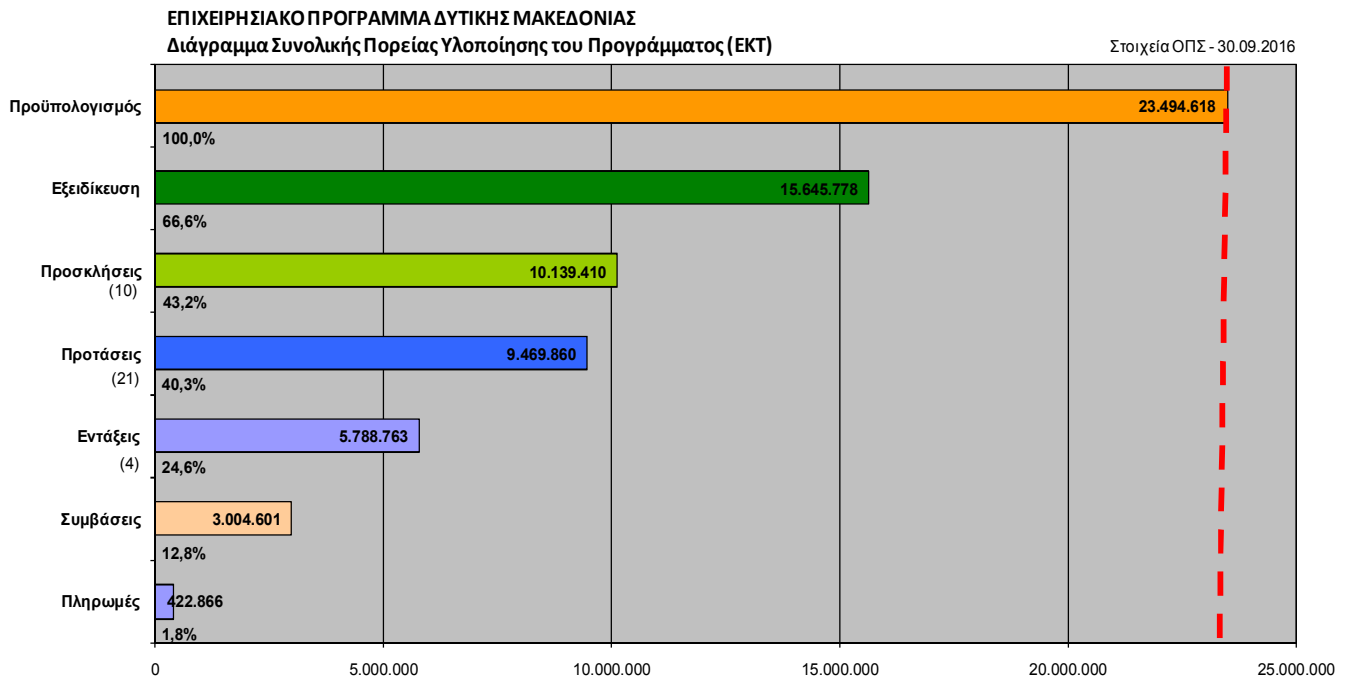

Σχήμα 5: Διάγραμμα Συνολικής Πορείας Υλοποίησης ΕΚΤ

Προβλέψεις προόδου υλοποίησης ΕΚΤ **μέχρι το τέλος του 2016:**

- Ο εκτιμώμενος π/υ **εξειδίκευσης** θα ανέρχεται σε 19,4 εκ. € (82,6%).
- Ο εκτιμώμενος π/υ **προσκήσεων** θα ανέρχεται σε 10,8 εκ. € (45,9%).
- Ο εκτιμώμενος π/υ **εντάξεων** θα ανέρχεται σε 9,7 εκ. € (41,3%).
- Ο εκτιμώμενος π/υ των **νομικών δεσμεύσεων** θα ανέρχεται σε 5,8 εκ. € (24,7%).
- Οι εκτιμώμενες **πληρωμές** θα ανέρχονται σε 4,0 € (17,1%).

Αναλυτικοί πίνακες με το σύνολο των Προσκήσεων, των Ενταγμένων Πράξεων και της πορείας υλοποίησης του ΕΠ ΠΔΜ αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ (www.pepdym.gr).

Τα στοιχεία των προσκήσεων και των ενταγμένων έργων αναρτώνται και στην ιστοσελίδα **ESPA.GR**.



2.4 Πρόοδος Υλοποίησης ανά Άξονα Προτεραιότητας

Η πρόοδος υλοποίησης ανά Άξονα Προτεραιότητας και των ενταγμένων πράξεων παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στους πίνακες του παραρτήματος.

Άξονας Προτεραιότητας 1: «Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας» (ΕΤΠΑ)

Στον ΑΠ 1 εγκρίθηκε η εξειδίκευση 2 δράσεων 8.360.312 € (80,7%).

- Δράσεις αναβάθμισης των υφιστάμενων και δημιουργίας νέων ερευνητικών υποδομών, π/υ 5.000.000 € (100%)
- Δράσεις συνεργασιών και δικτύωσης μεταξύ ερευνητικών φορέων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων σε τομείς προτεραιότητας του σχεδίου στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας, π/υ 3.360.312 € (62,7%).

Στον ΑΠ 1 ενεργοποιήθηκε μέσω 1 πρόσκλησης το ποσό των 4.500.000 € ή το 43,4% της ΣΔΔ του Άξονα, που αφορούν την ΕΠ 1.1 (1α):

- μία πρόσκληση για τις δράσεις αναβάθμισης των υφιστάμενων και δημιουργίας νέων ερευνητικών υποδομών, π/υ 4.500.000 €.

Υποβλήθηκε 1 πρόταση π/υ 4,5 εκ. €:

- Αναβάθμιση ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ, π/υ 4.500.000 €.

Η πρόταση είναι εναρμονισμένη τόσο με τον Εθνικό Χάρτη Ερευνητικών Υποδομών(Σχέδιο «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» (τομέας Ενέργειας)) όσο και με Περιφερειακό Σχέδιο Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3), που εγκρίθηκε το Δεκέμβριο του 2015.

Αναφορικά με την πορεία υλοποίησης της Στρατηγικής για την Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχουν υλοποιηθεί (3) θεματικά εργαστήρια σύμφωνα με τη διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης (στον κλάδο της γούνας και στον κλάδο της αγροδιατροφής & οινοποιίας-αμπελοαγωγίας) στο πλαίσιο εξειδίκευσης της Περιφερειακής στρατηγικής για την έξυπνη εξειδίκευση (RIS3). Ολοκληρώθηκε ή διαδικασία έγκρισης της εξειδίκευσης της δράσης 01.2.1.01 και η προετοιμασία της σχετικής πρόσκλησης π/υ 2.500.000 € για την ενίσχυση Επενδυτικών Σχεδίων καινοτομίας, έρευνας και ανάπτυξης επιχειρήσεων στους κλάδους γούνας, αγροδιατροφής και οίνου, και μέχρι το τέλος του Οκτ. 2016 θα αποσταλεί για γνωμοδότηση της ΕΥΚΕ, με στόχο να εκδοθεί η πρόσκληση εντός του Νοε του 2016.

Το Α' εξάμηνο του 2017 προβλέπεται και η υλοποίηση θεματικών εργαστηρίων για τους υπόλοιπους κλάδους της RIS3 (ενέργεια, περιβάλλον, τουρισμός).

Άξονας Προτεραιότητας 2: «Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών» (ΕΤΠΑ)

Δεν ενεργοποιήθηκαν δράσεις του Άξονα καθώς, με ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής, δεν έχει αρθεί η σχετική αυτοδέσμευση του ΕΠ ΠΔΜ που αφορά στην εναρμόνιση των προς χρηματοδότηση δράσεων με την «Εθνική Στρατηγική για την ψηφιακή Ανάπτυξη – Ψηφιακή Ελλάδα 2021».

Σε εξέλιξη η προετοιμασία του περιφερειακού σχεδίου για την ψηφιακή ανάπτυξη και τη δημιουργία μόνιμου μηχανισμού παρακολούθησης δεικτών ψηφιακής ανάπτυξης, που προβλέπεται να ολοκληρωθεί



εντός του 2016 (απαιτείται η εναρμόνιση αυτού με το νέο πλαίσιο για την υλοποίηση της Στρατηγικής για την Ψηφιακή Ανάπτυξη).

Το 2017 προβλέπεται η ενεργοποίηση του ΑΠ2 με την εξειδίκευση και έκδοση σχετικών προσκλήσεων για τις δράσεις υπηρεσιών και εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ανάδειξης πολιτισμού – τουρισμού, ηλεκτρονικής παιδείας και εφαρμογών υγείας – πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης.

Άξονας Προτεραιότητας 3: «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» (ΕΤΠΑ)

Στον ΑΠ 3 εγκρίθηκε η εξειδίκευση 2 δράσεων 4.375.000 € (14,1%).

- Δημιουργία θερμοκοιτίδας και στήριξη επιχειρήσεων Θερμοκοιτίδας (Incubator), π/υ 1.375.000 € (7,2%)
- Δημιουργία δομών στήριξης ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και εξωστρέφειας επιχειρήσεων, π/υ 3.000.000 € (15,6%).

Δεν ενεργοποιήθηκαν δράσεις του Άξονα καθώς εκκρεμούσαν ζητήματα α) κατάρτισης και έγκρισης κριτηρίων αξιολόγησης πράξεων κρατικών ενισχύσεων, β) εφαρμογής θεσμικού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων σε σχέση με τις Περιφερειακές RIS3 και γ) διαχείρισης δράσεων κρατικών ενισχύσεων και Περιφερειακής RIS3.

Επιπλέον εκκρεμούν ζητήματα επιλογής Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) για δράσεις «Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας».

Έχει ολοκληρωθεί η εξειδίκευση των προδιαγραφών για τη δημιουργία βιώσιμης δομής ανάπτυξης επιχειρηματικότητας, καθώς επίσης και η εξειδίκευση των προδιαγραφών δημιουργίας θερμοκοιτίδας.

Το 2017 προβλέπεται η ενεργοποίηση του ΑΠ3 με την έκδοση προσκλήσεων:

1. για τις δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, εκτιμώμενου π/υ 3,0 εκ. € και
2. για τις δράσεις θερμοκοιτίδας και δημιουργίας δομών στήριξης ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και εξωστρέφειας των επιχειρήσεων εκτιμώμενου π/υ 4,4 εκ. €.

Άξονας Προτεραιότητας 4: «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς» (ΕΤΠΑ)

Στον ΑΠ 4 εγκρίθηκε η εξειδίκευση 2 δράσεων 21.307.908 € (78,0%).

- Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων, π/υ 10.000.000 € (100,0%)
- Δράσεις δέσμευσης και αξιοποίησης του διοξειδίου του άνθρακα των ατμοηλεκτρικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, π/υ 11.307.908 € (100,0%).

Δεν ενεργοποιήθηκαν δράσεις του Άξονα καθώς, με ευθύνη του ΥΠΕΚΑ δεν ολοκληρώθηκε η αιρεσιμότητα που αφορά τη μελέτη για τη διασφάλιση των ελάχιστων απαιτήσεων που αφορούν στην ενεργειακή απόδοση κτηρίων σύμφωνα με το Άρθρο 3, το Άρθρο 4 και το Άρθρο 5 της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ, που αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2016.



Παρά ταύτα, βρίσκεται σε στάδιο ολοκλήρωσης η προετοιμασία του περιφερειακού σχεδίου για την ενεργειακή βελτίωση των δημοσίων κτιρίων και του περιφερειακού σχεδίου για την αξιοποίηση της βιομάζας με έμφαση στην τηλεθέρμανση, που προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2016 (απαιτείται η εναρμόνιση με τον Εθνικό Σχεδιασμό).

Το επόμενο διάστημα προβλέπεται η ενεργοποίηση του ΑΠ4 με την έκδοση προσκλήσεων:

1. για τις δράσεις ανάπτυξης - αναβάθμισης δικτύων τηλεθέρμανσης, εκτιμώμενου π/υ 6,0 εκ. €,
2. για τις δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων, εκτιμώμενου π/υ 10,0 εκ. € και
3. για τις δράσεις δέσμευσης και αξιοποίησης του διοξειδίου του άνθρακα των ατμοηλεκτρικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, π/υ 11,3 εκ. €.

Άξονας Προτεραιότητας 5: «Πρώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων» (ΕΤΠΑ)

Στον ΑΠ 5 εγκρίθηκε η εξειδίκευση 2 δράσεων 7.481.806 € (30,7%).

- Δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης πλημμυρικών φαινομένων, π/υ 4.981.806 € (22,8%)
- Δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης πυρκαγιών και λοιπών κινδύνων, π/υ 2.500.000 € (100,0%).

Μέχρι το τέλος του 2016 προβλέπεται η εξειδίκευση του συνόλου του ΑΠ5.

Ενεργοποιήθηκε μέσω 2 προσκλήσεων το ποσό των 8.670.000 € ή το 35,6% της ΣΔΔ του Άξονα, που αφορά τις δράσεις στην ΕΠ 5.1 (5b):

- πρόσκληση (κωδ.8^η) τις δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης πυρκαγιών και λοιπών κινδύνων στη Δυτική Μακεδονία (ΕΠ 5b), π/υ 3.070.000 €. Υποβλήθηκε 1 πρόταση ΣΔΔ 2.994.548,38 €. Εντάχθηκε 1 έργο που αφορά τον εξοπλισμό του Πυροσβεστικού Σώματος για τη Δυτική Μακεδονία ΣΔΔ 3.018.738,97 €.
- πρόσκληση (κωδ.16^η) τις δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης πλημμυρικών φαινομένων (ΕΠ 5b), π/υ 5.600.000 €. Υποβλήθηκε 1 πρόταση που αφορά την προστασία του ευρύτερου αστικού ιστού Βελβεντού από φυσικά φαινόμενα κατολισθήσεων και πλημμυρών ΣΔΔ 1.320.186,74 €.

Άξονας Προτεραιότητας 6: «Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και πρώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» (ΕΤΠΑ)

Στον ΑΠ 6 εγκρίθηκε η εξειδίκευση 5 δράσεων 30.711.984 € (50,3%).

- Έργα επέκτασης και αναβάθμισης υποδομών ύδρευσης για την εξασφάλιση της επάρκειας του νερού, π/υ 10.000.000 € (68,6%).
- Δράσεις βελτίωσης διαχείρισης των υδατικών πόρων σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης λεκανών απορροής της Περιφέρειας, π/υ 2.800.000 € (100,0%).

**ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

- Κατασκευή υποδομών διαχείρισης αστικών αποβλήτων (Αποχετευτικά δίκτυα και ΕΕΛ), π/υ 13.125.000 € (100,0%).
- Έργα ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς και λειτουργικής τους δικτύωσης, π/υ 3.118.000 € (27,4%).
- Δράσεις για την αποκατάσταση, διατήρηση και αξιοποίηση της βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένων των τόπων NATURA 2000, π/υ 1.668.984 € (53,4%).

Ενεργοποιήθηκε μέσω 6 προσκλήσεων το ποσό των 29.475.000 € ή το 48,2% της ΣΔΔ του Άξονα, που αφορούν την ΕΠ 6.1 (6b), την ΕΠ 6.2 (6c) και την ΕΠ 6.3 (6d):

- μία πρόσκληση (κωδ.5^η) για τις δράσεις υποδομών ύδρευσης για την εξασφάλιση της επάρκειας του νερού (ΕΠ 6b), π/υ 14.575.000 €. Υποβλήθηκαν 23 προτάσεις ΣΔΔ 47.140.731,95 €,
- μία πρόσκληση (κωδ.7^η) για τις δράσεις διαχείρισης των αστικών λυμάτων και της προστασίας των υδάτινων αποδεκτών της Περιφέρειας (ΕΠ 6b), π/υ 6.000.000 €. Υποβλήθηκαν 10 προτάσεις ΣΔΔ 24.635.456,37 €. Εντάχθηκαν 4 έργα, που αφορούν τη διαχείριση λυμάτων Κορησού Δ. Καστοριάς, παραλιμνίων αντλιοστασίων Δ. Καστοριάς, Δ. Αμυνταίου και οικισμών Βαθυλάκκου – Μεσιανής και Ροδίτη Δ. Σερβίων - Βελβεντού, ΣΔΔ 4.592.224 €. Υπογράφηκαν 2 συμβάσεις ΣΔΔ 2.305.104 €. Για το 1 έργο έγιναν πληρωμές ΣΔΔ 301.710,17 €.
- μία πρόσκληση (κωδ.9^η) για τις δράσεις βελτίωσης διαχείρισης των υδατικών πόρων σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης λεκανών απορροής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΠ 6b), π/υ 700.000 €.
- μία πρόσκληση (κωδ.12^η) για τις δράσεις για τη αποκατάσταση, διατήρηση και αξιοποίηση της βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένων των τόπων NATURA 2000 στη Δυτική Μακεδονία (ΕΠ 6d), π/υ 1.700.000 €. Υποβλήθηκαν 2 προτάσεις ΣΔΔ 1.729.598,13 €. Εντάχθηκαν 2 έργα που αφορούν τα δασοτεχνικά έργα ορεινής υδρονομίας στη λεκάνη Βυσινιάς Δ. Καστοριάς και την προμήθεια πολυμηχανήματος διαχείρισης καλαμιώνων λίμνης Καστοριάς ΣΔΔ 1.729.598,13 €. Για το 1 έργο έγιναν πληρωμές ΣΔΔ 1.273.464,33 €.
- μία πρόσκληση (κωδ.14^η) για τις δράσεις κατασκευής υποδομών διαχείρισης αστικών αποβλήτων (αποχετευτικά δίκτυα και ΕΕΛ) στη Δυτική Μακεδονία (ΕΠ 6d), π/υ 2.500.000 €. Υποβλήθηκε 1 πρόταση ΣΔΔ 1.910.793,12 €. Εντάχθηκε 1 έργο ΣΔΔ 1.553.304,76 €. Υπογράφηκε 1 σύμβαση ΣΔΔ 1.472.320,52 €.
- μία πρόσκληση (κωδ.15^η) για τις δράσεις έργων ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς και λειτουργικής τους δικτύωσης (ΕΠ 6c), π/υ 4.000.000 €. Προβλέπεται η υποβολή πρότασης και ένταξης του τμηματοποιημένου (phasing) έργου του κτιρίου της βιβλιοθήκης και εκθεσιακού χώρου της βιβλιοθήκης του Δ Κοζάνης.

Σε φάση προετοιμασίας βρίσκεται η ανάθεση της εκπόνησης σχεδίου ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο της τεχνικής βοήθειας του ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 που προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί το 1ο τρίμηνο του 2017 και ακολούθως να προκηρυχθούν οι σχετικές δράσεις.

Έχει εκπονηθεί η μελέτη για το Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης για τη Βιοποικιλότητα - Εξειδίκευση Δράσεων Προτεραιότητας για τη Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών στο πλαίσιο της τεχνικής βοήθειας του ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 και προγραμματίζεται η εξειδίκευση και η έκδοση 2^{ης} πρόσκλησης των σχετικών δράσεων το 1^ο εξάμηνο του 2017.



Η Επενδυτική Προτεραιότητα 6.4 (6ε) συνδέεται με την υλοποίηση των Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ). Ολοκληρώθηκε η έγκριση της διαδικασίας εφαρμογής και των κριτηρίων επιλογής των Επιχειρησιακών Σχεδίων στην 1η Επιτροπή Παρακολούθησης (23/06/2015). Έχει ολοκληρωθεί το 1ο στάδιο εφαρμογής (προετοιμασία πρόσκλησης, υποβολή προτάσεων, αξιολόγηση) και **έχουν επιλεγεί τα προσχέδια Επιχειρησιακών Σχεδίων Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης. Προγραμματίζεται η εφαρμογή του 2ου σταδίου για την επιλογή των τελικών Επιχειρησιακών Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, που προβλέπεται να ολοκληρωθεί στο 1ο εξάμηνο του 2017** και στη συνέχεια να εκδοθούν οι προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων επιλογής των πράξεων στο 3ο τρίμηνο του 2017.

Σε φάση ανάθεσης της εκπόνησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση για την αξιοποίηση των λιμνών της Δυτικής Μακεδονίας που προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί το 1ο εξάμηνο του 2017, και θα περιλαμβάνει και τις αντίστοιχες δράσεις προστασίας, αξιοποίησης και ανάδειξης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς που θα συμβάλλουν στην επίτευξη των δεικτών του Πλαισίου Επίδοσης.

Άξονας Προτεραιότητας 7: «Πρώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων» (ΕΤΠΑ)

Στον ΑΠ 7 εγκρίθηκε η εξειδίκευση 3 δράσεων 42.000.000 € (77,7%).

- Έργα ολοκλήρωσης καθέτων αξόνων Εγνατίας οδού (Νίκη Φλώρινας - Κοζάνη - όρια Ν. Λάρισας), π/υ 20.000.000 € (100,0%).
- Έργα λειτουργικής αναβάθμισης και οδικής ασφάλειας του ενδοπεριφερειακού οδικού δικτύου και διασύνδεσης με τους κάθετους άξονες και την Εγνατία οδό, π/υ 20.000.000 € (58,8%).
- Παρεμβάσεις Ενεργητικής Ασφάλειας Μεταφορών, π/υ 2.000.000 € (5,9%).

Ο ΑΠ 7 ενεργοποιήθηκε μέσω 1 πρόσκλησης στο ποσό των 3.700.000 € ή το 6,8% της ΣΔΔ του Άξονα, που αφορούν την ΕΠ 7.1 (7a) και την ΕΠ 7.2 (7b):

- μία πρόσκληση (κωδ.26¹⁾) για τις δράσεις πρώιμης των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων (ΕΠ 7b), π/υ 3.700.000 €.

Ολοκληρώθηκε η εξειδίκευση των δράσεων οδικής ενεργητικής ασφάλειας σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Εσωτερικών.

Μέχρι το τέλος του 2016 προβλέπεται η ενεργοποίηση του ΑΠ7 με την έκδοση προσκλήσεων:

1. για τις δράσεις κατασκευής τμημάτων καθέτων αξόνων Εγνατίας οδού (Νίκη Φλώρινας - Κοζάνη - όρια Ν. Λάρισας) (ΕΠ 7a), εκτιμώμενου π/υ 20,0 εκ. €,
2. για τις δράσεις λειτουργικής αναβάθμισης και οδικής ασφάλειας του ενδοπεριφερειακού οδικού δικτύου και διασύνδεσης με τους κάθετους άξονες και την Εγνατία οδό (ΕΠ 7b), εκτιμώμενου π/υ 20,0 εκ. € και
3. για τις παρεμβάσεις Ενεργητικής Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΠ 7b), εκτιμώμενου π/υ 2,0 εκ. €.

**Άξονας Προτεραιότητας 8: «Πρώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού» (ΕΚΤ)**

Δεν ενεργοποιήθηκαν δράσεις του Άξονα, καθώς δεν ολοκληρώθηκαν οι απαιτήσεις της αιρεσιμότητας και της αυτοδέσμευσης για τη δημιουργία μηχανισμού διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας (βρίσκεται σε εξέλιξη η προετοιμασία της δημιουργίας μηχανισμού για τη Διάγνωση των Αναγκών της Περιφερειακής Αγοράς Εργασίας και την Προώθηση της Διατηρήσιμης και Ποιοτικής Απασχόλησης).

Προβλέπεται η ολοκλήρωση της παραπάνω απαίτησης μέχρι το τέλος του 2016 και εντός του 2017 προβλέπεται η εξειδίκευση - ενεργοποίηση του ΑΠ8 με την έκδοση πρόσκλησης για τις δράσεις ενίσχυσης της αυτοαπασχόλησης και της επιχειρηματικότητας με έμφαση στους τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας, εκτιμώμενου π/υ 1,7 εκ. €.

Άξονας Προτεραιότητας 9: «Πρώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΤΠΑ)»

Στον ΑΠ 9 εγκρίθηκε η εξειδίκευση 3 δράσεων 18.240.115 € (78,5%).

- Δράσεις επέκτασης και αναβάθμισης υποδομών (Α'θμιας και Β'θμιας) υγείας, π/υ 10.000.000 € (66,7%).
- Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης κοινωνικών υποδομών, π/υ 7.240.115 € (87,9%).
- Δράσεις βελτίωσης προσβασιμότητας ΑμεΑ, π/υ 1.000.000 € (12,1%).

Μέχρι το τέλος του 2016 προβλέπεται η εξειδίκευση του συνόλου του ΑΠ9.

Ο ΑΠ 9 ενεργοποιήθηκε μέσω 3 προσκλήσεων στο ποσό των 11.500.000 € ή το 49,5% της ΣΔΔ του Άξονα, που αφορούν την ΕΠ 9.1 (9α):

- μία πρόσκληση (κωδ.4^η) τις δράσεις επέκτασης και αναβάθμισης υποδομών υγείας (ΕΠ 9α), π/υ 2.500.000 €. Υποβλήθηκαν 2 προτάσεις ΣΔΔ 1.659.975,34 €. Εντάχθηκαν 2 έργα που αφορούν το κτίριο του ΕΚΑΒ και την προμήθεια 14 ασθενοφόρων για τις ανάγκες του ΕΚΒΑ στη Δυτική Μακεδονία ΣΔΔ 1.659.975,34 €. Υπογράφηκαν 2 συμβάσεις ΣΔΔ 1.634.400,59 €. Για τα 2 έργα έγιναν πληρωμές ΣΔΔ 634.084,33 €.
- μία πρόσκληση (κωδ.13^η) τις δράσεις επέκτασης και αναβάθμισης υποδομών (Α'θμιας και Β'θμιας) υγείας (ΕΠ 9α), π/υ 5.500.000 €. Υποβλήθηκαν 2 προτάσεις ΣΔΔ 5.292.269,42 €. Εντάχθηκε 1 έργο που αφορά την προμήθεια ιατροτεχνολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού της μαιευτικής κλινικής και του τμήματος επειγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς ΣΔΔ 426.650,73 €. Σε διαδικασία ένταξης βρίσκεται και η 2^η πρόταση που αφορά το τμηματοποιημένο (phasing) έργο της προσθήκης πτέρυγας κατ' επέκταση του υπάρχοντος κτιρίου και προμήθειας - εγκατάστασης ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας "Μποδοσάκειου".
- μία πρόσκληση (κωδ.25^η) τις δράσεις επέκτασης και αναβάθμισης υποδομών (Α'θμιας και Β'θμιας) υγείας (ΕΠ 9α), π/υ 3.500.000 €

Σε φάση ολοκλήρωσης βρίσκεται το τελικό Σχέδιο χαρτογράφησης των υποδομών τομέα υγείας Δυτικής Μακεδονίας από την 3^η ΥΠΕ σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας.

**Άξονας Προτεραιότητας 10: «Πρώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)»**

Στον ΑΠ 10 εγκρίθηκε η εξειδίκευση 4 δράσεων 15.213.361 € (71,4%).

- Ολοκληρωμένα προγράμματα μικρής κλίμακας για την πρόωση στην απασχόληση μειονεκτούντων ατόμων που βιώνουν ή κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό, π/υ 4.656.000 € (21,9%).
- Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών (παιδικοί / βρεφικοί / βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΔΑΠ, κλπ) για άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που βιώνουν ή κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό με στόχο την ένταξή τους ή την παραμονή τους στην αγορά εργασίας, π/υ 6.694.690 € (77,4%).
- Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά με Αναπηρία, π/υ 725.591 € (88,0%) και
- Δράσεις Κοινωνικής Φροντίδας και Προστασίας, π/υ 3.137.080 € (179,3%).

Ο ΑΠ 10 ενεργοποιήθηκε μέσω 7 προσκλήσεων στο ποσό των 9.706.993 € ή το 45,6% της ΣΔΔ του Άξονα, που αφορούν την ΕΠ 10.1 (9i), ΕΠ 10.2 (9iii) και ΕΠ 10.3 (9iv):

- μία πρόσκληση (κωδ.1^η) τις δράσεις εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής (παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών για άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών που βιώνουν ή κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό με στόχο την ένταξή τους ή την παραμονή τους στην αγορά εργασίας (ΕπΠα 9i), π/υ 3.378.145 €. Υποβλήθηκε 1 πρόταση ΣΔΔ 3.378.145 €. Εντάχθηκε 1 έργο ΣΔΔ 2.847.566,57 €. Υπογράφηκε 1 σύμβαση ΣΔΔ 2.845.737,23 €, Για 1 έργο έγιναν πληρωμές ΣΔΔ 327.547,44 €.
- μία πρόσκληση (κωδ.2^η) τις δράσεις εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής (Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με αναπηρίες) (ΕΠ 9iii), π/υ 435.355 €. Υποβλήθηκε 1 πρόταση ΣΔΔ 158.863,50 €. Εντάχθηκε 1 έργο ΣΔΔ 158.863,50 €. Υπογράφηκε 1 σύμβαση ΣΔΔ 158.863,50 €, Για 1 έργο έγιναν πληρωμές ΣΔΔ 95.318,12 €.
- μία πρόσκληση (κωδ.17^η) τις δράσεις Κοινωνικής Φροντίδας και Προστασίας / Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) (ΕΠ 9iv), π/υ 715.000 €. Υποβλήθηκαν 6 προτάσεις ΣΔΔ 628.297,87 €.
- μία πρόσκληση (κωδ.19^η) τις δράσεις Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με αναπηρία (ΚΔΑΠ/ΑΜΕΑ) (ΕΠ 9iii), π/υ 290.236 €. Υποβλήθηκε 1 πρόταση ΣΔΔ 290.236 €. Εντάχθηκε 1 έργο, που αφορά το 2^ο κύκλο εναρμόνισης της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για την περίοδο 2016-2017 ΣΔΔ 290.236 €.
- μία πρόσκληση (κωδ.20^η) τις δράσεις παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών για άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που βιώνουν ή κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό με στόχο την ένταξη τους ή την παραμονή τους (ΕΠ 9i), π/υ 2.492.097 €. Υποβλήθηκε 1 πρόταση ΣΔΔ 3.316.545 €. Εντάχθηκε 1 έργο που αφορά το 2^ο κύκλο δράσεων εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για την περίοδο 2016-2017 ΣΔΔ 2.492.097 €.
- μία πρόσκληση (κωδ.23^η) τις δράσεις Κοινωνικής Φροντίδας και Προστασίας / Κέντρα Κοινότητας (ΕΠ 9iv), π/υ 1.244.160 €. Υποβλήθηκαν 11 προτάσεις ΣΔΔ 1.421.280 € και



- μία πρόσκληση (κωδ.27^η) τις δράσεις προώθησης της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ), που αφορά τα Κέντρα Δημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ (ΚΔΗΦ/ΑμεΑ) (ΕΠ 9ιν), π/υ 1.152.000 €.

Οι δράσεις υλοποιούνται σε εναρμόνιση με το Περιφερειακό Σχέδιο για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας (ΠεΣΚΕ) Δυτικής Μακεδονίας, που ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 2015.

Σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας προωθείται η δημιουργία του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης που προβλέπεται να λειτουργεί στο πλαίσιο της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Για τις δράσεις κοινωνικής επιχειρηματικότητας της ΕΠ 10.4 (9ν), εκκρεμεί η δημιουργία του Περιφερειακού Μηχανισμού Υποστήριξης της ανάπτυξης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, που προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός του 2016 με ευθύνη του Υπ. Εργασίας. Εντός Νοε 2016 αναμένεται να ψηφιστεί ο νέος νόμος για την «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και Ανάπτυξη των Φορέων της».

Μέχρι το τέλος του 2016 προβλέπεται η εξειδίκευση και η ενεργοποίηση της δράσης 10.2.1.02 «Συμβουλευτική και Ψυχολογική Υποστήριξη» που αφορά τις δομές Συμβουλευτικών Κέντρων και Ξενώνων Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων βίας, π/υ 650 χιλ. €.

Άξονας Προτεραιότητας 11: «Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση» (ΕΤΠΑ)

Στον ΑΠ 11 εγκρίθηκε η εξειδίκευση 3 δράσεων 59.740.115 € (100,0%).

- Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης υποδομών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, π/υ 50.000.000 € (100,0%).
- Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης υποδομών σχολικής εκπαίδευσης, π/υ 5.740.115 € (100,0%).
- Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης υποδομών προσχολικής εκπαίδευσης, π/υ 4.000.000 € (100,0%).

Ο ΑΠ 11 ενεργοποιήθηκε μέσω 2 προσκλήσεων στο ποσό των 55.240.115 € ή το 92,5% της ΣΔΔ του Άξονα, που αφορούν την ΕΠ 11.1 (10α):

- μία πρόσκληση (κωδ.3^η) τις δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης υποδομών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΕΠ 10α), π/υ 49.500.000 €. Υποβλήθηκε 1 πρόταση ΣΔΔ 49.500.000 €. Εντάχθηκε 1 έργο που αφορά τη δημιουργία Πανεπιστημιούπολης Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη ΣΔΔ 49.500.000 €. Υπογράφηκε η αντίστοιχη σύμβαση ΣΔΔ 19.410.168,62 €.
- μία πρόσκληση (κωδ.6^η) τις δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης υποδομών σχολικής εκπαίδευσης (ΕΠ 10α), π/υ 5.740.115 €. Υποβλήθηκαν 4 προτάσεις ΣΔΔ 12.301.171,68 €.

Ολοκληρώθηκε το σχέδιο Χαρτογράφησης των υποδομών και των αναγκών τομέα παιδείας από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Υπ. Παιδείας σε συνεργασία με την ΕΥΔ ΕΠ/ΠΑΜ.

Μέχρι το τέλος του 2016 προβλέπεται η ενεργοποίηση των δράσεων ανάπτυξης και αναβάθμισης υποδομών προσχολικής εκπαίδευσης, εκτιμώμενου π/υ 4,0 εκ. €, καθώς επίσης η έκδοση του 2^{ου} κύκλου προσκλήσεων για τις δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης υποδομών τριτοβάθμιας εκπ/σης και σχολικής εκπ/σης.

**Άξονας Προτεραιότητας 12: «Τεχνική Βοήθεια (ΕΤΠΑ)»**

Στον ΑΠ 12 εγκρίθηκε η εξειδίκευση 3 δράσεων 5.654.781 € (100,0%).

- Δράσεις προετοιμασίας, εφαρμογής, παρακολούθησης, επιθεώρησης, π/υ 2.854.781 € (100,0%).
- Δράσεις αξιολόγησης και εκπόνησης μελετών προετοιμασίας δράσεων του προγράμματος, π/υ 1.800.000 € (100,0%).
- Δράσεις πληροφόρησης και δημοσιοποίησης του προγράμματος, π/υ 1.000.000 € (100,0%).

Ο ΑΠ 12 ενεργοποιήθηκε μέσω 2 προσκλήσεων στο ποσό των 5.654.781 € ή το 100,0% της ΣΔΔ του Άξονα, που αφορούν την ΕΠ 12.1:

- μία πρόσκληση (κωδ.10^η) τις δράσεις προετοιμασίας, εφαρμογής, παρακολούθησης, επιθεώρησης (ΕΚΤ) & Δράσεις πληροφόρησης και δημοσιοποίησης του προγράμματος (ΕΤΠΑ) στη Δυτική Μακεδονία (ΕΠ 12.1), π/υ 3.854.781 €. Υποβλήθηκαν 3 προτάσεις ΣΔΔ 1.420.000 €. Εντάχθηκαν 3 έργα, που αφορούν τις υπηρεσίες συμβούλων τεχνικής υποστήριξης, την οργάνωση εκδηλώσεων – συνεδριάσεων και τα έξοδα μετακινήσεων εσωτερικού - εξωτερικού του ανθρωπίνου δυναμικού ΣΔΔ 1.420.000 €.
- μία πρόσκληση (κωδ.18^η) τις δράσεις αξιολόγησης και εκπόνησης μελετών προετοιμασίας δράσεων του Προγράμματος (ΕΤΠΑ) (ΕΠ 12.1), π/υ 1.800.000 €. Υποβλήθηκε 1 πρόταση ΣΔΔ 1.320.186,74 €.

Άξονας Προτεραιότητας 13: «Τεχνική Βοήθεια (ΕΚΤ)»

Στον ΑΠ 13 εγκρίθηκε η εξειδίκευση 3 δράσεων 432.417 € (100,0%).

- Δράσεις προετοιμασίας, εφαρμογής, παρακολούθησης, επιθεώρησης (ΕΚΤ), π/υ 232.417 € (100,0%).
- Δράσεις αξιολόγησης και εκπόνησης μελετών προετοιμασίας δράσεων του προγράμματος (ΕΚΤ) π/υ 100.000 € (100,0%).
- Δράσεις πληροφόρησης και δημοσιοποίησης των δράσεων ΕΚΤ, π/υ 100.000 € (100,0%).

Ο ΑΠ 13 ενεργοποιήθηκε μέσω 3 προσκλήσεων στο ποσό των 432.417 € ή το 100,0% της ΣΔΔ του Άξονα, που αφορούν την ΕΠ 13.1:

- μία πρόσκληση (κωδ.11^η) τις δράσεις προετοιμασίας, εφαρμογής, παρακολούθησης, επιθεώρησης (ΕΚΤ) & Δράσεις πληροφόρησης και δημοσιοποίησης των δράσεων ΕΚΤ (ΕΠ 13.1), π/υ 232.417 €.
- μία πρόσκληση (κωδ.21^η) τις δράσεις αξιολόγησης και εκπόνησης μελετών προετοιμασίας δράσεων του Προγράμματος (ΕΚΤ) (ΕΠ 13.1), π/υ 100.000 € και
- μία πρόσκληση (κωδ.22^η) τις δράσεις πληροφόρησης και δημοσιοποίησης των δράσεων (ΕΚΤ) (ΕΠ 13.1), π/υ 100.000 €.

Μέχρι το τέλος του 2016 προβλέπεται η ένταξη και η υλοποίηση δράσεων της τεχνικής βοήθειας του ΑΠ 13 (ΕΚΤ).



3. Προβλέψεις Δαπανών – Κάλυψη Προκαταβολής / Προχρηματοδότησης 2015-2016

Πίνακας 1. Στόχοι Δαπανών ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 για το έτος 2016

ΕΔΕΤ	Προϋπολογισμός Προγράμματος		Δημοσιονομικός Στόχος Δαπανών*		Ποσό που αντιστοιχεί στο 7% Πρόσθετης Προχρηματοδότησης	
	Κοινοτική Συνδρομή	Δημόσια Δαπάνη	Κοινοτική Συνδρομή	Δημόσια Δαπάνη	Κοινοτική Συνδρομή	Δημόσια Δαπάνη
ΕΤΠΑ	245.794.494	307.243.123	27.685.809	34.607.262	16.150.055	20.187.570
ΕΚΤ	18.795.693	23.494.398	2.764.000	3.454.968	1.234.892	1.543.616
Σύνολο Προγράμματος	264.590.187	330.737.521	30.449.809	38.062.230	17.384.948	21.731.185

* Σύμφωνα με το υπ. αριθμ. πρωτοκ. 29341/15-03-2016 έγγραφο του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, με θέμα: «Κατάρτιση Σχεδίων Δράσης δαπανών έτους 2016 των Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2014 - 2020»

Πίνακας 2: Προβλέψεις Πληρωμών 2016 – 2017 (όπως δηλώθηκαν μέσω SFC - Ιαν 2016)

ΑΠ	ΤΑΜΕΙΟ	Π/Υ Άξονα (ΔΔ)	Αποθεματικό Επίδοσης (ΔΔ)	Προβλέψεις Δαπανών								
				ΙΑΝ - ΟΚΤ 2016 (1)	ΝΟΕ-ΔΕΚ 2016 (2)	ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ 2016 (3=1+2)	%ΑΠ	%ΑΕ	ΕΤΟΣ 2017 (4)	Σύνολο 2016-2017	%ΑΠ	%ΑΕ
1	ΕΤΠΑ	10.360.312	2.800.000	0	50.000	50.000	0,5%	0,5%	3.950.000	4.000.000	38,6%	142,9%
2	ΕΤΠΑ	10.360.312	2.800.000	0	0	0	0,0%	0,0%	800.000	800.000	7,7%	28,6%
3	ΕΤΠΑ	31.080.937	10.000.000	0	0	0	0,0%	0,0%	5.900.000	5.900.000	19,0%	59,0%
4	ΕΤΠΑ	27.307.908	7.900.000	0	0	0	0,0%	0,0%	7.530.000	7.530.000	27,6%	95,3%
5	ΕΤΠΑ	24.354.612	7.500.000	400.000	3.380.000	3.780.000	15,5%	15,5%	3.030.000	6.810.000	28,0%	90,8%
6	ΕΤΠΑ	61.111.089	16.500.000	3.609.000	2.430.000	6.039.000	9,9%	9,9%	12.260.000	18.299.000	29,9%	110,9%
7	ΕΤΠΑ	54.032.942	17.000.000	400.000	885.000	1.285.000	2,4%	2,4%	10.500.000	11.785.000	21,8%	69,3%
8	ΕΚΤ	1.753.367	600.000	0	0	0	0,0%	0,0%	1.000.000	1.000.000	57,0%	166,7%
9	ΕΤΠΑ	23.240.115	8.000.000	1.360.000	2.600.000	3.960.000	17,0%	17,0%	9.114.000	13.074.000	56,3%	163,4%
10	ΕΚΤ	21.308.834	9.500.000	1.750.000	1.650.000	3.400.000	16,0%	16,0%	4.400.000	7.800.000	36,6%	82,1%
11	ΕΤΠΑ	59.740.115	18.000.000	2.200.000	3.000.000	5.200.000	8,7%	8,7%	12.500.000	17.700.000	29,6%	98,3%
12	ΕΤΠΑ	5.654.781		85.000	182.600	267.600	4,7%	4,7%	750.000	1.017.600	18,0%	
13	ΕΚΤ	432.417		20.000	35.000	55.000	12,7%	12,7%	35.000	90.000	20,8%	
Σύνολο		330.737.741	100.600.000	9.824.000	14.212.600	24.036.600	7,3%	23,9%	71.769.000	95.805.600	29,0%	95,2%
ΕΤΠΑ		307.243.123	90.500.000	8.054.000	12.527.600	20.581.600	6,7%	22,7%	66.334.000	86.915.600	28,3%	96,0%
ΕΚΤ		23.494.618	10.100.000	1.770.000	1.685.000	3.455.000	14,7%	34,2%	5.435.000	8.890.000	37,8%	88,0%

Μέχρι το τέλος του 2016:

Οι συνολικές εκτιμώμενες πληρωμές του προγράμματος ανέρχονται σε 24,1 εκ. €, δηλαδή 111% του στόχου που αφορά τη συνολική πρόσθετη προχρηματοδότηση ποσού 21,7 εκ. €. Ειδικότερα ανά ταμείο:

- ♦ Για το **ΕΤΠΑ**, οι εκτιμώμενες πληρωμές ανέρχονται σε 20,1 εκ. €, δηλαδή 99,7% του στόχου που αφορά την πρόσθετη προχρηματοδότηση του ΕΤΠΑ ποσού 20,18 εκ. €,
- ♦ Για το **ΕΚΤ**, οι εκτιμώμενες πληρωμές ανέρχονται σε 4,0 εκ. €, δηλαδή 268% του στόχου που αφορά την πρόσθετη προχρηματοδότηση του ΕΚΤ ποσού 1,5 εκ. €.



4. Ζητήματα που επηρεάζουν την επίδοση του προγράμματος και μέτρα που λαμβάνονται

4.1 Ζητήματα ανά Άξονα Προτεραιότητας (ΑΠ)

ΑΠ 1, 3 (ΕΤΠΑ)

Υπάρχει ανάγκη συντονισμού με το Τομεακό Πρόγραμμα ΕΠΑΝΕΚ, ώστε να εξασφαλιστεί η συνέργεια και η συμπληρωματικότητα των Δράσεων του ΕΠ ΠΑΜΘ 2014 – 2020 με τις Δράσεις που έχει ήδη προκηρύξει το ΕΠΑΝΕΚ για το σύνολο της Χώρας. Παράλληλα απαιτείται να γίνουν διαδικασίες για την επιλογή και τον ορισμό Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΔΦ) Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων.

Ζητήματα που καθυστερούσαν την ενεργοποίηση της Περιφερειακής RIS3 έχουν σε σημαντικό βαθμό αντιμετωπισθεί, ολοκληρώθηκε η εξειδίκευση της Επ. Πρωτ. 1.2. Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της σχετικής πρόσκλησης π/υ 2.500.000 € για την ενίσχυση Επενδυτικών Σχεδίων καινοτομίας, έρευνας και ανάπτυξης επιχειρήσεων στους κλάδους γούνας, αγροδιατροφής και οίνου, και μέχρι το τέλος του Οκτ. 2016 θα αποσταλεί για γνωμοδότηση της ΕΥΚΕ, με στόχο να εκδοθεί εντός του Νοε του 2016. Η πρόσκληση εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει ως υπόδειγμα για την ενεργοποίηση ανάλογων δράσεων στους τομείς προτεραιότητας της Περιφερειακής RIS3 και ως συνεπώς στην ενεργοποίηση του συνόλου του ΑΠ1.

ΑΠ 2 (ΕΤΠΑ)

Η μη ολοκλήρωση, από τον αρμόδιο φορέα, Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής, του στρατηγικού πλαισίου για την ψηφιακή ανάπτυξη. Η ανωτέρω υστέρηση δεν επιτρέπει, λόγω σχετικής αυτοδέσμευσης, την εξειδίκευση των δράσεων του ΑΠ 2 και ειδικότερα της Επ. Πρωτ. 2.1 (2c).

Για την κάλυψη της ανωτέρω υστέρησης γίνονται ενέργειες από τον αρμόδιο φορέα σε εθνικό επίπεδο. Όπως αποτυπώνεται και στις εκθέσεις προόδου εκπλήρωσης των αιρεσιμοτήτων η κάλυψη της σχετικής αιρεσιμότητας παρουσιάζει σημαντική υστέρηση.

ΑΠ 4 (ΕΤΠΑ)

Η μη θέσπιση μέτρων, από τον αρμόδιο φορέα, Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Δ/ση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας, για τη διασφάλιση των ελάχιστων απαιτήσεων που αφορούν στην ενεργειακή απόδοση κτηρίων σύμφωνα με το Άρθρο 3, το Άρθρο 4 και το Άρθρο 5 της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ (ΘΣ4/Επ.Πρ.4γ). Η ανωτέρω υστέρηση δεν επιτρέπει την έκδοση πρόσκλησης για ένταξη πράξεων στο ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 και ως εκ τούτου την ενεργοποίηση της Δράσης 04.1.1.2 σύμφωνα με την 1^η εξειδίκευση του ΕΠ ΠΔΜ.

Για την κάλυψη της ανωτέρω υστέρησης γίνονται ενέργειες από τον αρμόδιο φορέα σε εθνικό επίπεδο και οι οποίες αποτυπώνονται αναλυτικά στις εκθέσεις προόδου εκπλήρωσης των αιρεσιμοτήτων και σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη (Σεπτέμβριος 2016) η αιρεσιμότητα αναμένεται να εκπληρωθεί στις 31/12/2016.

ΑΠ 6 (ΕΤΠΑ)

Η καθυστέρηση, από τον αρμόδιο φορέα, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ειδική Γραμματεία Υδάτων, στην κάλυψη της αιρεσιμότητας που αφορά στον τομέα των υδατικών πόρων και ειδικότερα στη διαμόρφωση τιμολογιακής πολιτικής για τις χρήσεις του ύδατος. Η ανωτέρω υστέρηση ενδέχεται να επηρεάσει δυσμενώς την υλοποίηση της Δράσης 06.1.1.01 κύρια στο σκέλος της δήλωσης δαπανών.

Για την κάλυψη της ανωτέρω υστέρησης γίνονται ενέργειες από τον αρμόδιο φορέα σε εθνικό επίπεδο και οι οποίες αποτυπώνονται αναλυτικά στις εκθέσεις προόδου εκπλήρωσης των αιρεσιμοτήτων και σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη (Σεπτέμβριος 2016) η αιρεσιμότητα αναμένεται να εκπληρωθεί στις 31/12/2016.



ΑΠ 10 (ΕΚΤ)

Η καθυστέρηση, του αρμόδιου φορέα, Υπουργείο Υγείας, Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, στην εξειδίκευση του ΘΣ9/ΕΠ 10.3 (9iv) και ειδικότερα του Ειδικού Στόχου 10.3.1 που αφορά στη «βελτίωση προσβασιμότητας και συμμετοχή μειονεκτούντων ατόμων στα αγαθά της υγείας και της πρόνοιας».

Καταβάλλονται από κοινού προσπάθειες με την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΥΣΕΚΤ) για την επιτάχυνση της εξειδίκευσης των σχετικών δράσεων.

Η καθυστέρηση, του αρμόδιου φορέα, Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων, στην εξειδίκευση του ΘΣ9/ΕΠ 10.4 (9v) και ειδικότερα του Ειδικού Στόχου 10.4.1 που αφορά στην «αύξηση της απασχόλησης ευάλωτων ομάδων μέσω προώθησης της κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων».

Τον Οκτώβριο 2016 ολοκληρώθηκε από το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων, το νέο θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης σχετικών δράσεων (Νόμος για την «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και Ανάπτυξη των Φορέων της και λοιπές διατάξεις»). Στο Νόμο που αναμένεται να ψηφιστεί εντός του Νοεμβρίου του 2016, προβλέπεται και η ίδρυση Ειδικής Γραμματείας στο Υπουργείο, η οποία θα αναλάβει μεταξύ άλλων να εκδώσει έναν οριζόντιο Οδηγό για ενδεικτικές επιλέξιμες δράσεις για τις Περιφέρειες στα τέλη του Νοεμβρίου.

4.2 Γενικά ζητήματα

Καταγράφεται η ανάγκη επιτάχυνσης διαδικασιών που αφορούν στην οριστικοποίηση του θεσμικού πλαισίου δημοσίων συμβάσεων (υπηρεσιών, προμηθειών και έργων). Ειδικότερα η αδυναμία εφαρμογής, κυρίως λόγω της μη έγκυρης προετοιμασίας από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΥΣΥ), πρότυπων τευχών διακηρύξεων / προκηρύξεων μετά την εφαρμογή του Ν. 4412/2016 «Προγραμματισμός, ανάθεση, σύναψη και εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», έχει οδηγήσει σε πλήρη αναστολή δημοπράτησης όλων των νέων έργων.

Επίσης κρίσιμα για ομαλή υλοποίηση του ΕΠ ΠΔΜ είναι ζητήματα κατάρτισης, ειδικά σε θέματα κρατικών ενισχύσεων και σε σχέση με τα έργα υποδομών, χρηματοοικονομικών αναλύσεων, λειτουργίας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) αλλά και του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Επίσης, σημαντική για την αποτελεσματική υλοποίηση του ΕΠ ΠΔΜ είναι και η λειτουργία των προβλεπόμενων περιφερειακών μηχανισμών διακυβέρνησης και παρακολούθησης στρατηγικών, όπως του μηχανισμού για τη διακυβέρνηση της Περιφερειακής RIS3, του συστήματος διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας, του περιφερειακού παρατηρητήριου για την κοινωνική ένταξη, της υποστήριξης της ανάπτυξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Η ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ έχει εξειδικεύσει, κύρια μέσα από την Τεχνική Βοήθεια τις αναγκαίες δράσεις για την υποστήριξη του συνόλου των ανωτέρω μηχανισμών, απαιτείται όμως, η επιτάχυνση της δημιουργίας και λειτουργίας των ανωτέρω μηχανισμών και σε συμφωνία με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην κατάρτιση των Τελικών Δικαιούχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος αλλά και στην γενικότερη υποστήριξη αυτών μέσω συγκεκριμένων δράσεων υποστήριξης (πρωτοβουλία ΜΟΔ Α.Ε.)



5. Πρόοδος Υλοποίησης Δεικτών Εκρών και Πλαισίου Επίδοσης

5.1 Πρόοδος Δεικτών Εκρών

Στην παρούσα φάση καταγράφεται η πρόοδος των δεικτών του προγράμματος (επιχειρησιακοί δείκτες) σε σχέση με τις τιμές των δεικτών των εντάξεων.

Μέχρι το τέλος του 2016 ενεργοποιούνται οι δείκτες που αφορούν στους άξονες προτεραιότητας 1, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 και 13. Οι δείκτες των αξόνων προτεραιότητας 2, 3, 4 και 8 προβλέπεται να ενεργοποιηθούν το 2017.

Στον **πίνακα 3** παρουσιάζεται η συνολική πρόοδος των επιχειρησιακών δεικτών του προγράμματος.

Σε συνεργασία και με το συντονισμό της ΕΥΣΣΑ βρίσκεται σε εξέλιξη η ομογενοποίηση του συστήματος δεικτών όλων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, αποτέλεσμα της οποίας αναμένεται να είναι και η ανάγκη τροποποίησης μερικών δεικτών του ΕΤΠΑ (περιγραφή, μεθοδολογία μέτρησης, τιμή στόχου, κ.α.).

Σε συνεργασία και με το συντονισμό της ΕΥΣΣΑ και ΕΥΣΕΚΤ βρίσκεται σε εξέλιξη η ομογενοποίηση των δεικτών του ΕΚΤ, τόσο των δεικτών εκρών όσο και των δεικτών αποτελεσμάτων έτσι ώστε να υπάρχει κοινή μεθοδολογία προσδιορισμού και μέτρησης των δεικτών. Αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι και η ανάγκη τροποποίησης μερικών δεικτών του ΕΚΤ (περιγραφή, μεθοδολογία μέτρησης, τιμή στόχου, κ.α.).

Επιπλέον μπορεί να υπάρχει ανάγκη προσθήκης και νέων δεικτών που προκύπτουν κατά τη φάση εξειδίκευσης και έκδοσης προσκλήσεων των αντίστοιχων δράσεων.

Τα ανωτέρω θέματα θα εξετασθούν αναλυτικά κατά την «1^η Αξιολόγηση κατά τη διάρκεια υλοποίησης του ΕΠ ΠΔΜ 2014 – 2020» και αναλόγως θα προταθούν ενέργειες στο πλαίσιο της 1^{ης} αναθεώρησης του ΕΠ ΠΔΜ 2014 – 2020, που ενδεικτικά δύναται να περιλαμβάνουν αύξηση της τιμής στόχου για το 2023, μεταφορά πόρων, και άλλες τροποποιήσεις.



Πίνακας 3. Πρόδος Υλοποίησης Επιχειρησιακών Δεικτών ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020

Κωδικός Άξονα	ΕΠ		Κωδικός Ειδικού Στόχου	Περιγραφή Ειδικού Στόχου	Κωδικός Δείκτη	Περιγραφή Δείκτη	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή-Στόχος (2023)			Εντάξεις 30/09/2016				Εκτίμηση Εντάξεων 31/12/2016			
								A	Γ	Σ	A	Γ	Σ	%	A	Γ	Σ	%
01	01.1	1a	01.1.1	Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών για την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας σε τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας	CO25	Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός ερευνητών που εργάζονται σε βελτιωμένες εγκαταστάσεις ερευνητικών κέντρων	Ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης			30							15	50%
01	01.1	1a	01.1.1	Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών για την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας σε τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας	T2101	Ερευνητικές Υποδομές που ενισχύονται / αναβαθμίζονται	Ερευνητικές Υποδομές			3							1	33%
01	01.2	1b	01.2.1	Αύξηση της συμμετοχής των επιχειρήσεων σε προγράμματα έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας σε τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας	CO26	Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα	Επιχειρήσεις			16								



ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Κωδικός Άξονα	ΕΠ		Κωδικός Ειδικού Στόχου	Περιγραφή Ειδικού Στόχου	Κωδικός Δείκτη	Περιγραφή Δείκτη	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή-Στόχος (2023)			Εντάξεις 30/09/2016				Εκτίμηση Εντάξεων 31/12/2016				
								A	Γ	Σ	A	Γ	Σ	%	A	Γ	Σ	%	
01	01.2	1b	01.2.1	Αύξηση της συμμετοχής των επιχειρήσεων σε προγράμματα έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας σε τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας	CO27	Έρευνα, καινοτομία: Ιδιωτικές επενδύσεις που συνδυάζονται με δημόσια στήριξη στον τομέα της καινοτομίας ή σε έργα έρευνας και ανάπτυξης	Ευρώ			2.000.000									
02	02.1	2c	02.1.1	Βελτίωση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις	T2102	Αριθμός ψηφιακών υπηρεσιών που δημιουργούνται / αναβαθμίζονται	Αριθμός			20									
03	03.1	3a	03.1.1	Βελτίωση της επιχειρηματικότητας με έμφαση στην καινοτομία και στους τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας	CO01	Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη	Επιχειρήσεις			240									
03	03.1	3a	03.1.1	Βελτίωση της επιχειρηματικότητας με έμφαση στην καινοτομία και στους τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της	CO02	Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις	Επιχειρήσεις			220									



ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Κωδικός Άξονα	ΕΠ		Κωδικός Ειδικού Στόχου	Περιγραφή Ειδικού Στόχου	Κωδικός Δείκτη	Περιγραφή Δείκτη	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή-Στόχος (2023)			Εντάξεις 30/09/2016				Εκτίμηση Εντάξεων 31/12/2016			
								A	Γ	Σ	A	Γ	Σ	%	A	Γ	Σ	%
				Περιφέρειας														
03	03.1	3a	03.1.1	Βελτίωση της επιχειρηματικότητας με έμφαση στην καινοτομία και στους τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας	CO04	Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη	Επιχειρήσεις			20								
03	03.1	3a	03.1.1	Βελτίωση της επιχειρηματικότητας με έμφαση στην καινοτομία και στους τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας	CO08	Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση	Ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης			200								
03	03.2	3d	03.2.1	Ενίσχυση του εξωστρεφούς προσανατολισμού των επιχειρήσεων	CO01	Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη	Επιχειρήσεις			70								
03	03.2	3d	03.2.1	Ενίσχυση του εξωστρεφούς προσανατολισμού των επιχειρήσεων	CO02	Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις	Επιχειρήσεις			70								



ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Κωδικός Άξονα	ΕΠ		Κωδικός Ειδικού Στόχου	Περιγραφή Ειδικού Στόχου	Κωδικός Δείκτη	Περιγραφή Δείκτη	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή-Στόχος (2023)			Εντάξεις 30/09/2016				Εκτίμηση Εντάξεων 31/12/2016				
								A	Γ	Σ	A	Γ	Σ	%	A	Γ	Σ	%	
03	03.2	3d	03.2.1	Ενίσχυση του εξωστρεφούς προσανατολισμού των επιχειρήσεων	CO08	Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση	Ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης			70									
04	04.1	4c	04.1.1	Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και χρήσης ΑΠΕ με έμφαση στις υποδομές του δημόσιου τομέα	CO30	Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Πρόσθετη δυναμικότητα παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας	MW			3									
04	04.1	4c	04.1.1	Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και χρήσης ΑΠΕ με έμφαση στις υποδομές του δημόσιου τομέα	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	kWh/έτος			2.200.000									
04	04.1	4c	04.1.1	Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και χρήσης ΑΠΕ με έμφαση στις υποδομές του δημόσιου τομέα	CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	Τόννοι ισοδυνάμου CO2			550									
04	04.1	4c	04.1.1	Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και χρήσης ΑΠΕ με έμφαση στις υποδομές του δημόσιου τομέα	T2103	Αριθμός δημόσιων κτιρίων που βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση και χρήση ΑΠΕ	Αριθμός			60									



ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Κωδικός Άξονα	ΕΠ		Κωδικός Ειδικού Στόχου	Περιγραφή Ειδικού Στόχου	Κωδικός Δείκτη	Περιγραφή Δείκτη	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή-Στόχος (2023)			Εντάξεις 30/09/2016				Εκτίμηση Εντάξεων 31/12/2016				
								A	Γ	Σ	A	Γ	Σ	%	A	Γ	Σ	%	
04	04.2	4f	04.2.1	Ανάπτυξη τεχνολογικών εφαρμογών δέσμμευσης και αξιοποίησης του διοξειδίου του άνθρακα των ατμοηλεκτρικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας	CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	Τόνοι ισοδυνάμου CO2			5.500									
05	05.1	5b	05.1.1	Βελτίωση της πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης των κινδύνων με έμφαση στους φυσικούς κινδύνους	CO20	Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά μέτρα	Άτομα			25.000						5.400	22%		
05	05.1	5b	05.1.1	Βελτίωση της πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης των κινδύνων με έμφαση στους φυσικούς κινδύνους	CO21	Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα δασικής πυροπροστασίας	Άτομα			95.000		95.000	100%			95.000	100%		
06	06.1	6b	06.1.1	Βελτίωση της διαχείρισης των υδατικών πόρων σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης λεκανών απορροής της Περιφέρειας	CO18	Υδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης	Άτομα			20.000						31.466	157%		



ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Κωδικός Άξονα	ΕΠ		Κωδικός Ειδικού Στόχου	Περιγραφή Ειδικού Στόχου	Κωδικός Δείκτη	Περιγραφή Δείκτη	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή-Στόχος (2023)			Εντάξεις 30/09/2016				Εκτίμηση Εντάξεων 31/12/2016			
								Α	Γ	Σ	Α	Γ	Σ	%	Α	Γ	Σ	%
06	06.1	6b	06.1.1	Βελτίωση της διαχείρισης των υδατικών πόρων σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης λεκανών απορροής της Περιφέρειας	T2104	Κατασκευή – βελτίωση – αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης	Χιλιόμετρα			150						22	14%	
06	06.1	6b	06.1.2	Βελτίωση της διαχείρισης των αστικών λυμάτων και της προστασίας των υδάτινων αποδεκτών της Περιφέρειας με έμφαση στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Ισοδύναμο πληθυσμού			24000		23.323	97%			23.323	97%	
06	06.1	6b	06.1.2	Βελτίωση της διαχείρισης των αστικών λυμάτων και της προστασίας των υδάτινων αποδεκτών της Περιφέρειας με έμφαση στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας	T2105	Μήκος αποχετευτικού δικτύου	Χιλιόμετρα			240		31,49	13%			31,49	13%	
06	06.2	6c	06.2.1	Ενίσχυση της προστασίας και ανάδειξης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και σύνδεση με την τουριστική ανάπτυξη	CO09	Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών	Επισκέψεις/έτος			100.000						40.000	40%	



ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Κωδικός Άξονα	ΕΠ		Κωδικός Ειδικού Στόχου	Περιγραφή Ειδικού Στόχου	Κωδικός Δείκτη	Περιγραφή Δείκτη	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή-Στόχος (2023)			Εντάξεις 30/09/2016				Εκτίμηση Εντάξεων 31/12/2016			
								A	Γ	Σ	A	Γ	Σ	%	A	Γ	Σ	%
06	06.2	6c	06.2.1	Ενίσχυση της προστασίας και ανάδειξης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και σύνδεση με την τουριστική ανάπτυξη	T2106	Δράσεις αξιοποίησης και ανάδειξης φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς	Αριθμός			18							1	6%
06	06.3	6d	06.3.1	Βελτίωση της διαχείρισης, προστασίας και ανάδειξης των προστατευόμενων περιοχών της Περιφέρειας	CO23	Φύση και βιοποικιλότητα: Επιφάνεια οικοτόπων που λαμβάνουν ενίσχυση για να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης	Εκτάρια			44.000			50.400	115%			50.400	115%
06	06.4	6e	06.4.1	Βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος με έμφαση στις περιοχές ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης	CO37	Αστική ανάπτυξη: Πληθυσμός που ζει σε περιοχές με ολοκληρωμένες στρατηγικές αστικής ανάπτυξης	Άτομα			75.000								
06	06.4	6e	06.4.1	Βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος με έμφαση στις περιοχές ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης	CO38	Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές	Τετραγωνικά μέτρα			100.000								
07	07.1	7a	07.1.1	Βελτίωση των μεταφορικών υποδομών που συνδέουν την Περιφέρεια με το ΔΕΔ-Μ	CO13	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών	χλμ			6,7								



ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Κωδικός Άξονα	ΕΠ		Κωδικός Ειδικού Στόχου	Περιγραφή Ειδικού Στόχου	Κωδικός Δείκτη	Περιγραφή Δείκτη	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή-Στόχος (2023)			Εντάξεις 30/09/2016				Εκτίμηση Εντάξεων 31/12/2016			
								A	Γ	Σ	A	Γ	Σ	%	A	Γ	Σ	%
07	07.1	7a	07.1.1	Βελτίωση των μεταφορικών υποδομών που συνδέουν την Περιφέρεια με το ΔΕΔ-Μ	CO13a	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	χλμ			6,7								
07	07.2	7b	07.2.1	Βελτίωση της ποιότητας των ενδοπεριφερειακών μετακινήσεων μέσω της σύνδεσης αστικών κέντρων και περιοχών ιδιαίτερου ενδιαφέροντος με τους κάθετους άξονες και την Εγνατία οδό	CO14	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών	χλμ			40						2,5	6%	
08	08.1	8iii	08.1.1	Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης και της επιχειρηματικότητας με έμφαση στους τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας	CO01	Ανεργοί, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων	Αριθμός	70	105	175								
09	09.1	9a	09.1.1	Βελτίωση - ολοκλήρωση υποδομών Α'θμιας και Β'θμιας υγείας και πρόνοιας	CO36	Υγεία: Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας	Άτομα			268.859			40.000	15%			147.340	55%



ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Κωδικός Άξονα	ΕΠ		Κωδικός Ειδικού Στόχου	Περιγραφή Ειδικού Στόχου	Κωδικός Δείκτη	Περιγραφή Δείκτη	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή-Στόχος (2023)			Εντάξεις 30/09/2016				Εκτίμηση Εντάξεων 31/12/2016			
								A	Γ	Σ	A	Γ	Σ	%	A	Γ	Σ	%
09	09.1	9a	09.1.1	Βελτίωση - ολοκλήρωση υποδομών Α'θμιας και Β'θμιας υγείας και πρόνοιας	T2107	Υποδομές μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας Υγείας που δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται	Αριθμός			8			3	38%			6	75%
09	09.1	9a	09.1.1	Βελτίωση - ολοκλήρωση υποδομών Α'θμιας και Β'θμιας υγείας και πρόνοιας	T2108	Αριθμός Υποδομών Κοινωνικής Φροντίδας	Αριθμός			4								
10	10.1	9i	10.1.1	Ενίσχυση της πρόσβασης στην απασχόληση για μειονεκτούντα άτομα που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας	T2109	Μειονεκτούντα άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας ανήλικων τέκνων	Φυσικά πρόσωπα	448	1794	2.242	2	1253	2.652	118%	2	1253	2.652	118%
10	10.1	9i	10.1.1	Ενίσχυση της πρόσβασης στην απασχόληση για μειονεκτούντα άτομα που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας	T2110	Μειονεκτούντα άτομα που βιώνουν ή κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό	Φυσικά πρόσωπα	78	310	388								
10	10.2	9iii	10.2.1	Καταπολέμηση των άμεσων, έμμεσων και πολλαπλών διακρίσεων και εμποδίων λόγω αναπηρίας ή ψυχικής ασθένειας	T2109	Μειονεκτούντα άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας ανήλικων τέκνων	Φυσικά πρόσωπα	15	60	75	0	25	70	93%	0	25	70	93%
10	10.3	9iv	10.3.1	Βελτίωση προσβασιμότητας και συμμετοχή μειονεκτούντων	CO17	Άλλα μειονεκτούντα άτομα	Αριθμός	5143	7714	12.857								



ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Κωδικός Άξονα	ΕΠ		Κωδικός Ειδικού Στόχου	Περιγραφή Ειδικού Στόχου	Κωδικός Δείκτη	Περιγραφή Δείκτη	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή-Στόχος (2023)			Εντάξεις 30/09/2016				Εκτίμηση Εντάξεων 31/12/2016			
								A	Γ	Σ	A	Γ	Σ	%	A	Γ	Σ	%
				ατόμων στα αγαθά της υγείας και της πρόνοιας														
10	10.3	9iv	10.3.1	Βελτίωση προσβασιμότητας και συμμετοχή μειονεκτούντων ατόμων στα αγαθά της υγείας και της πρόνοιας	T2111	Μειονεκτούντα άτομα που αποκτούν πρόσβαση σε υπηρεσίες πρόνοιας	Φυσικά πρόσωπα	62	93	155						560	361%	
10	10.4	9v	10.4.1	Αύξηση της απασχόλησης ευάλωτων ομάδων μέσω προώθησης της κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων	CO01	Ανεργοί, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων	Αριθμός	22	33	55								
10	10.4	9v	10.4.1	Αύξηση της απασχόλησης ευάλωτων ομάδων μέσω προώθησης της κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων	CO23	Αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας)	Αριθμός	0	0	8								
11	11.1	10a	11.1.1	Δημιουργία σύγχρονων υποδομών Γ'θμιας Εκπαίδευσης και βελτίωση - ολοκλήρωση υποδομών Α'θμιας και Β'θμιας εκπαίδευσης	CO35	Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης	Άτομα			2.000			1.500	75%		1.795	90%	



ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Κωδικός Άξονα	ΕΠ		Κωδικός Ειδικού Στόχου	Περιγραφή Ειδικού Στόχου	Κωδικός Δείκτη	Περιγραφή Δείκτη	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή-Στόχος (2023)			Εντάξεις 30/09/2016				Εκτίμηση Εντάξεων 31/12/2016			
								A	Γ	Σ	A	Γ	Σ	%	A	Γ	Σ	%
11	11.1	10a	11.1.1	Δημιουργία σύγχρονων υποδομών Γ'θμιας Εκπαίδευσης και βελτίωση - ολοκλήρωση υποδομών Α'θμιας και Β'θμιας εκπαίδευσης	T2112	Αριθμός Υποδομών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που ενισχύονται	Αριθμός			2			1	50%			1	50%
11	11.1	10a	11.1.1	Δημιουργία σύγχρονων υποδομών Γ'θμιας Εκπαίδευσης και βελτίωση - ολοκλήρωση υποδομών Α'θμιας και Β'θμιας εκπαίδευσης	T2113	Αίθουσες διδασκαλίας προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κατασκευάζονται - βελτιώνονται	Αριθμός			30							26	87%
12	12.1		12.1.1	Ενίσχυση της αποτελεσματικής διαχείρισης και εφαρμογής του προγράμματος	T2114	Μελέτες - Εμπειρογνωμοσύνες - Έρευνες - Αξιολογήσεις	Αριθμός			12							2	
12	12.1		12.1.1	Ενίσχυση της αποτελεσματικής διαχείρισης και εφαρμογής του προγράμματος	T2115	Υπηρεσίες Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης	Αριθμός			8			8	100%			8	100%
12	12.1		12.1.1	Ενίσχυση της αποτελεσματικής διαχείρισης και εφαρμογής του προγράμματος	T2116	Αριθμός Εκδηλώσεων (Ενεργειών Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης)	Αριθμός			20			20	100%			20	100%
12	12.1		12.1.1	Ενίσχυση της αποτελεσματικής διαχείρισης και εφαρμογής του προγράμματος	T2117	Ενέργειες Πληροφόρησης και Δημοσιότητας	Αριθμός			25							2	



ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Κωδικός Άξονα	ΕΠ	Κωδικός Ειδικού Στόχου	Περιγραφή Ειδικού Στόχου	Κωδικός Δείκτη	Περιγραφή Δείκτη	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή-Στόχος (2023)			Εντάξεις 30/09/2016				Εκτίμηση Εντάξεων 31/12/2016				
							A	Γ	Σ	A	Γ	Σ	%	A	Γ	Σ	%	
			προγράμματος															
12	12.1	12.1.1	Ενίσχυση της αποτελεσματικής διαχείρισης και εφαρμογής του προγράμματος	T2118	Σύμβουλοι Δημοσιότητας	Αριθμός			1									
12	12.1	12.1.1	Ενίσχυση της αποτελεσματικής διαχείρισης και εφαρμογής του προγράμματος	T2119	Τεχνολογικός Εξοπλισμός	Αριθμός			12									
13	13.1	13.1.1	Ενίσχυση της αποτελεσματικής διαχείρισης και εφαρμογής του προγράμματος (ΕΚΤ)	T2114	Μελέτες - Εμπειρογνομούσυνες - Έρευνες - Αξιολογήσεις	Αριθμός			2									
13	13.1	13.1.1	Ενίσχυση της αποτελεσματικής διαχείρισης και εφαρμογής του προγράμματος (ΕΚΤ)	T2115	Υπηρεσίες Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης	Αριθμός			3									
13	13.1	13.1.1	Ενίσχυση της αποτελεσματικής διαχείρισης και εφαρμογής του προγράμματος (ΕΚΤ)	T2116	Αριθμός Εκδηλώσεων (Ενεργειών Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης)	Αριθμός			5									
13	13.1	13.1.1	Ενίσχυση της αποτελεσματικής διαχείρισης και εφαρμογής του προγράμματος (ΕΚΤ)	T2117	Ενέργειες Πληροφόρησης και Δημοσιότητας	Αριθμός			5									1



ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Κωδικός Άξονα	ΕΠ	Κωδικός Ειδικού Στόχου	Περιγραφή Ειδικού Στόχου	Κωδικός Δείκτη	Περιγραφή Δείκτη	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή-Στόχος (2023)			Εντάξεις 30/09/2016				Εκτίμηση Εντάξεων 31/12/2016					
							Α	Γ	Σ	Α	Γ	Σ	%	Α	Γ	Σ	%		
13	13.1	13.1.1	Ενίσχυση της αποτελεσματικής διαχείρισης και εφαρμογής του προγράμματος (ΕΚΤ)	T2118	Σύμβουλοι Δημοσιότητας	Αριθμός			1										



5.2 Πρόοδος Πλαισίου Επίδοσης

Στην παρούσα φάση καταγράφεται η πρόοδος των δεικτών εκρών του Πλαισίου Επίδοσης του προγράμματος (επιχειρησιακοί δείκτες) σε σχέση με τις τιμές των δεικτών των εντάξεων.

Μέχρι το τέλος του 2016 ενεργοποιούνται οι δείκτες που αφορούν στους άξονες προτεραιότητας 1, 5, 6, 7, 9, 10 και 11. Οι δείκτες των αξόνων προτεραιότητας 2, 3, 4 και 8 προβλέπεται να ενεργοποιηθούν το 2017.

Προβλέπεται ικανοποιητικός βαθμός προόδου εντός του 2017 για τους άξονες προτεραιότητας 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10 και 11.

Σε κάθε περίπτωση είναι αναγκαία η επιτάχυνση της υλοποίησης του προγράμματος στο σύνολο των αξόνων προτεραιότητας και ειδικότερα στους άξονες προτεραιότητας 2, 3 και 8.

Στον **πίνακα 4** παρουσιάζεται η συνολική πρόοδος του Πλαισίου Επίδοσης του προγράμματος.

Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη ενότητα ενδέχεται, στο πλαίσιο της συνεργασίας με την ΕΥΣΣΑ και την ΕΥΣΕΚΤ για την ομογενοποίηση του συστήματος δεικτών όλων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, να υπάρξει αναγκαιότητα τροποποίησης μερικών δεικτών εκρών που εντάσσονται στο πλαίσιο επίδοσης.



Πίνακας 4. Πρόδος Υλοποίησης Πλαισίου Επίδοσης ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020

ΑΠ	Κωδικός	Δείκτης ή Βασικό Στάδιο Υλοποίησης	Μονάδα Μέτρησης	Ορόσημο 2018	Εντάξεις 30/09/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	%	Εκτίμηση 2017	%
01	T2101	Ερευνητικές Υποδομές που ενισχύονται / αναβαθμίζονται	Ερευνητικές Υποδομές	2	0	1	50,0%	3	150,0%
	CO26	Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα	Επιχειρήσεις	5	0	0	0,0%	8	160,0%
	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	EURO	2.800.000	0	200.000	7,1%	1.750.000	62,5%
02	T2102	Αριθμός ψηφιακών υπηρεσιών που δημιουργούνται / αναβαθμίζονται	Αριθμός	8	0	0			
	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	EURO	2.800.000	0	0			
03	CO02	Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις	Επιχειρήσεις						
	K201	Ενταγμένα έργα	Αριθμός	290	0	0	0,0%	120	41,4%
	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	EURO	10.000.000	0	0	0,0%	3.450.000	34,5%
04	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	kWh/έτος	1.200.000	0	0	0,0%	1.500.000	125,0%
	CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	Τόνοι ισοδυνάμου CO2						
	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	Αριθμός	1	0	0	0,0%	1	100,0%
	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	EURO	7.900.000	0	0	0,0%	9.000.000	113,9%
05	CO20	Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά μέτρα	Άτομα						
	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	Αριθμός	4	0	1	25,0%	5	125,0%
	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	EURO	7.500.000	0	2.600.000	34,7%	4.200.000	56,0%



ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠ	Κωδικός	Δείκτης ή Βασικό Στάδιο Υλοποίησης	Μονάδα Μέτρησης	Ορόσημο 2018	Εντάξεις 30/09/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	%	Εκτίμηση 2017	%
06	CO09	Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών	Επισκέψεις/έτος						
	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	Αριθμός	7	1	1	14,3%	4	57,1%
	CO18	Υδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης	Άτομα	8.500		31.466	370,2%	70.000	823,5%
	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Ισοδύναμο πληθυσμού	6.500		23.323	358,8%	65.000	1000,0%
	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	EURO	16.500.000	301.710	6.076.330	36,8%	17.900.000	108,5%
07	CO14	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών	χλμ						
	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	Αριθμός	3	0	2	66,7%	4	133,3%
	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	EURO	17.000.000		1.488.000	8,8%	5.700.000	33,5%
08	CO01	Ανεργοί, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων	Αριθμός	60		0			
	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	EURO	600.000		0			
09	CO36	Υγεία: Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας	Άτομα	95.000		147.340	155,1%	160.000	168,4%
	T2108	Αριθμός Υποδομών Κοινωνικής Φροντίδας	Αριθμός	2		0	0,0%	3	150,0%
	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	EURO	8.000.000	634.084	4.396.594	55,0%	8.500.000	106,3%
10	T2109	Μειονεκτούντα άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας ανήλικων τέκνων	Φυσικά πρόσωπα	1.260		2.652	210,5%	2.652	210,5%
	CO17	Άλλα μειονεκτούντα άτομα	Αριθμός	7.714					
	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	EURO	9.500.000	422.866	4.005.865	42,2%	11.449.100	120,5%
11	CO35	Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης	Άτομα						



ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠ	Κωδικός	Δείκτης ή Βασικό Στάδιο Υλοποίησης	Μονάδα Μέτρησης	Ορόσημο 2018	Εντάξεις 30/09/2016	Εκτίμηση 31/12/2016	%	Εκτίμηση 2017	%
	T2113	Αίθουσες διδασκαλίας προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κατασκευάζονται - βελτιώνονται	Αριθμός	25		26	104,0%	26	104,0%
	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	Αριθμός	2	1	2	100,0%	3	150,0%
	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	EURO	18.000.000		4.900.000	27,2%	10.800.000	60,0%



6. Ενημέρωση για την Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης έτους 2015 του ΕΠ ΠΔΜ 2014 - 2020

Το Μάιο του 2015 συντάχθηκε η «Έκθεση Υλοποίησης Έτους 2015 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 – 2020 (Μέρος Α)», σε συνέχεια των με αριθμ. πρωτ. 44629/ΕΥΣΣΑ 833/25.04.2016 Οδηγιών της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΑΣ/ΕΥΣΣΑ) για την Κατάρτιση των Ετήσιων Εκθέσεων Υλοποίησης των Προγραμμάτων της Περιόδου 2014 – 2020.

Το περιεχόμενο της Ετήσιας Έκθεσης περιλαμβάνει:

1. Επισκόπηση της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος
2. Υλοποίηση ανά άξονα προτεραιότητας
 - α) Επισκόπηση της υλοποίησης
 - β) Κοινοί δείκτες και ειδικοί δείκτες του προγράμματος
 - γ) Δημοσιονομικά στοιχεία
3. Σύνοψη των Αξιολογήσεων
4. Ζητήματα που επηρεάζουν τις επιδόσεις του προγράμματος και μέτρα που λαμβάνονται.

Η Έκθεση Υλοποίησης Έτους 2015 του ΕΠ ΠΔΜ 2014 – 2020 (Μέρος Α) εγκρίθηκε με την με αριθμ. πρωτ. 2063/30-05-2016, Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ ΠΔΜ 2014 – 2020, η οποία ελήφθη μέσω Γραπτής Διαδικασίας και υποβλήθηκε στις 31-05-2016 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ανταλλαγής δεδομένων των Κρατών – Μελών με την ΕΕ (SFC2014). Έγινε αποδεκτή από την ΕΕ στις 20-07-2016 και στον ακόλουθο σύνδεσμο http://www.pepdym.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=704&Itemid=99 δημοσιεύεται, σύμφωνα με το άρθρο 50(9) του Κανονισμού ΕΕ 1303/2013 η Έκθεση Υλοποίησης έτους 2015 του ΕΠ ΠΔΜ 2014 – 2020 και η αντίστοιχη περίληψη για τους Πολίτες.

Ζητήματα που θα πρέπει να αντιμετωπισθούν στις επόμενες Ετήσιες Εκθέσεις του ΕΠ ΠΔΜ 2014 – 2020, σε συνέχεια σχετικών επισημάνσεων της ΕΕ αφορούν κύρια στην εξέταση της αναγκαιότητας επικαιροποίησης Δεικτών Εκρών και Αποτελέσματος, τόσο ως προς την τιμή βάσης και την τιμή στόχου, αλλά όσο και ως προς την καταλληλότητα του Δείκτη σε σχέση με τη λογική της παρέμβασης. Επίσης θα πρέπει να περιληφθεί διακριτή αναφορά τυχόν ευρημάτων των αξιολογήσεων.



Παράρτημα

Πίνακας πορείας υλοποίησης ανά Άξονα Προτεραιότητας και Επενδυτική Προτεραιότητα

Πίνακας ενταγμένων έργων ανά Άξονα Προτεραιότητας και Επενδυτική Προτεραιότητα



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020

Πίνακας πορείας υλοποίησης ανα Αξονα Προτεραιότητας και Επενδυτική Προτεραιότητα

Στοιχεία ΟΠΣ - 30/09/2016

Κωδικός	Αξονας Προτεραιότητας / Επενδυτική Προτεραιότητα	Π/Υ	Εξειδίκευση	Προσκλήσεις	Προτάσεις	Εντάξεις	Συμβάσεις	Πληρωμές	Πληρ / Συμβ
01	Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας	10.360.312	8.360.312	4.500.000	4.500.000	0	0	0	0,0%
01.1	Ενίσχυση των υποδομών έρευνας και καινοτομίας (Ε&Κ)	5.000.000	5.000.000	4.500.000	4.500.000	0	0	0	0,0%
01.2	Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ε&Κ, ανάπτυξης δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης	5.360.312	3.360.312	0	0	0	0	0	0,0%
02	Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών	10.360.312	0	0	0	0	0	0	0,0%
02.1	Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ για ηλεκτρονική κυβέρνηση, ηλεκτρονική μάθηση, ηλεκτρονική ένταξη, ηλεκτρονικό πολιτισμό και ηλεκτρονική υγεία	10.360.312	0	0	0	0	0	0	0,0%
03	Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων	31.080.937	4.375.000	0	0	0	0	0	0,0%
03.1	Προαγωγή της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής αξιοποίησης νέων ιδεών και ενίσχυσης της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων και μέσω θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων	24.780.937	4.375.000	0	0	0	0	0	0,0%
03.2	Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας	6.300.000	0	0	0	0	0	0	0,0%
04	Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς	27.307.908	21.307.908	0	0	0	0	0	0,0%
04.1	Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτιρίων, και στον τομέα της στέγασης	16.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0,0%
04.2	Πρώθηση της έρευνας και της καινοτομίας στις τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και της υιοθέτησης αυτών	11.307.908	11.307.908	0	0	0	0	0	0,0%
05	Πρώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων	24.354.612	7.481.806	8.670.000	4.314.735	3.018.739	0	0	0,0%
05.1	Προαγωγή επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφαλίζοντας την ανθεκτικότητα σε καταστροφές και αναπτύσσοντας συστήματα διαχείρισης καταστροφών	24.354.612	7.481.806	8.670.000	4.314.735	3.018.739	0	0	0,0%



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020

Πίνακας πορείας υλοποίησης ανα Αξονα Προτεραιότητας και Επενδυτική Προτεραιότητα

Στοιχεία ΟΠΣ - 30/09/2016

Κωδικός	Αξονας Προτεραιότητας / Επενδυτική Προτεραιότητα	Π/Υ	Εξειδίκευση	Προσκήσεις	Προτάσεις	Εντάξεις	Συμβάσεις	Πληρωμές	Πληρ / Συμβ
06	Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων	61.111.089	30.711.984	29.475.000	75.416.580	6.321.822	3.654.088	301.710	8,3%
06.1	Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτημένου της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος	30.500.000	25.925.000	23.775.000	73.686.981	4.592.224	2.305.104	301.710	13,1%
06.2	Διατήρηση, προστασία, προαγωγή και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς	19.375.000	3.118.000	4.000.000	0	0	0	0	0,0%
06.3	Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προαγωγής των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων μέσω και του δικτύου NATURA 2000 και των «πράσινων» υποδομών	5.000.000	1.668.984	1.700.000	1.729.598	1.729.598	1.348.984	0	0,0%
06.4	Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, για την ανάπτυξη των πόλεων, τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου	6.236.089	0	0	0	0	0	0	0,0%
07	Πρώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων	54.032.942	42.000.000	3.700.000	0	0	0	0	0,0%
07.1	Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0,0%
07.2	Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων στην υποδομή ΔΕΔ-Μ, συμπεριλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων	34.032.942	22.000.000	3.700.000	0	0	0	0	0,0%
08	Πρώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού	1.753.367	0	0	0	0	0	0	0,0%
08.1	Πρώθηση της αυτοαπασχόλησης, της επιχειρηματικότητας και της δημιουργίας επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων	1.753.367	0	0	0	0	0	0	0,0%
09	Πρώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΤΠΑ)	23.240.115	18.240.115	11.500.000	6.952.245	2.086.626	1.634.401	634.084	38,8%
09.1	Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και στις κοινωνικές υποδομές	23.240.115	18.240.115	11.500.000	6.952.245	2.086.626	1.634.401	634.084	38,8%
10	Πρώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)	21.308.834	15.213.361	9.706.993	9.469.860	5.788.763	3.004.601	422.866	14,1%
10.1	Ενεργός ένταξη, με σκοπό, μεταξύ άλλων, της προώθησης της ισότητας των ευκαιριών, και της ενεργού συμμετοχής και της βελτίωσης της απασχολησιμότητας	13.408.834	11.350.690	5.870.242	6.694.690	5.339.664	2.845.737	327.547	11,5%
10.2	Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση της ισότητας των ευκαιριών	824.400	725.591	725.591	725.591	449.100	158.864	95.318	60,0%





ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020

Πίνακας πορείας υλοποίησης ανα Αξονα Προτεραιότητας και Επενδυτική Προτεραιότητα

Στοιχεία ΟΠΣ - 30/09/2016

Κωδικός	Αξονας Προτεραιότητας / Επενδυτική Προτεραιότητα	Π/Υ	Εξειδίκευση	Προσκλήσεις	Προτάσεις	Εντάξεις	Συμβάσεις	Πληρωμές	Πληρ / Συμβ
10.3	Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων της υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών γενικού συμφέροντος	6.250.000	3.137.080	3.111.160	2.049.579	0	0	0	0,0%
10.4	Προαγωγή της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ένταξης σε κοινωνικές επιχειρήσεις	825.600	0	0	0	0	0	0	0,0%
11	Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση	59.740.115	59.740.115	55.240.115	61.801.172	49.500.000	19.410.169	0	0,0%
11.1	Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση	59.740.115	59.740.115	55.240.115	61.801.172	49.500.000	19.410.169	0	0,0%
12	Τεχνική Βοήθεια (ΕΤΠΑ)	5.654.781	5.654.781	5.654.781	1.420.000	1.420.000	0	0	0,0%
12.1	Τεχνική Βοήθεια (ΕΤΠΑ)	5.654.781	5.654.781	5.654.781	1.420.000	1.420.000	0	0	0,0%
13	Τεχνική Βοήθεια (ΕΚΤ)	432.417	432.417	432.417	0	0	0	0	0,0%
13.1	Τεχνική Βοήθεια (ΕΚΤ)	432.417	432.417	432.417	0	0	0	0	0,0%
	ΣΥΝΟΛΟ	330.737.741	213.517.799	128.879.306	163.874.591	68.135.950	27.703.258	1.358.660	4,9%
		100,0%	64,6%	39,0%	49,5%	20,6%	8,4%	0,4%	
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΠΑ	307.243.123	197.872.021	118.739.896	154.404.731	62.347.187	24.698.657	935.795	3,8%
		100,0%	64,4%	38,6%	50,3%	20,3%	8,0%	0,3%	
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤ	23.494.618	15.645.778	10.139.410	9.469.860	5.788.763	3.004.601	422.866	14,1%
		100,0%	66,6%	43,2%	40,3%	24,6%	12,8%	1,8%	





ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020

Πίνακας ενταγμένων έργων ανά Άξονα Προτεραιότητας και Επενδυτική Προτεραιότητα

Στοιχεία ΟΠΣ - 30/09/2016

Κωδικός / MIS	Τίτλος	Φορέας	Ημ. Ένταξης Αριθ. Έργων	Εντάξεις	Συμβάσεις	Πληρωμές	Πληρ / Συμβ
05	Πρώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων		1	3.018.739	0	0	0,0%
05.1	Προαγωγή επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφαλίζοντας την ανθεκτικότητα σε καταστροφές και αναπτύσσοντας συστήματα διαχείρισης καταστροφών		1	3.018.739	0	0	0,0%
5000629	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ	08/04/2016	3.018.739			0,0%
06	Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων		6	6.321.822	3.654.088	301.710	8,3%
06.1	Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτημένου της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος		4	4.592.224	2.305.104	301.710	13,1%
5000493	Αποχετευτικό δίκτυο ακαθάρτων οικισμού Κορησού	ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ	16/06/2016	1.460.900			0,0%
5000494	Βελτίωση και εκσυγχρονισμός των παραλίμνιων αντλιοστασίων λυμάτων Δήμου Καστοριάς	ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ	16/06/2016	832.783	832.783	301.710	36,2%
5000499	ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ	ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ	16/06/2016	745.236			0,0%
5001561	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΒΑΘΥΛΛΑΚΟΥ, ΜΕΣΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΡΟΔΙΤΗΣ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	29/08/2016	1.553.305	1.472.321		0,0%
06.3	Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προαγωγής των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων μέσω και του δικτύου NATURA 2000 και των «πράσινων» υποδομών		2	1.729.598	1.348.984	0	0,0%
5001580	Εκτέλεση δημοσίων δασοτεχνικών έργων ορεινής υδρονομίας σε τμήματα των λεκανών του υδατορέματος Βυσινιάς (ΚΑ 110503) σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις στην περιοχή του Δήμου Καστοριάς της Π.Ε. Καστοριάς	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	19/07/2016	1.349.598	1.348.984		0,0%
5001595	Προμήθεια πολυμηχανήματος για τη διαχείριση των οικοτόπων υπερυδατικής βλάστησης (καλαμώνες) στη λίμνη Καστοριάς	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	12/08/2016	380.000			0,0%
09	Πρώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΤΠΑ)		3	2.086.626	1.634.401	634.084	38,8%
09.1	Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και στις κοινωνικές υποδομές		3	2.086.626	1.634.401	634.084	38,8%
5000311	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 14 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ	08/03/2016	837.753	837.753	136.220	16,3%
5000638	ΚΕΝΤΡΟ Ε.Κ.Α.Β. ΚΟΖΑΝΗΣ	ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ	27/04/2016	822.222	796.648	497.864	62,5%





ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020

Πίνακας ενταγμένων έργων ανά Άξονα Προτεραιότητας και Επενδυτική Προτεραιότητα

Στοιχεία ΟΠΣ - 30/09/2016

Κωδικός / MIS	Τίτλος	Φορέας	Ημ. Ενταξης Αριθ. Έργων	Εντάξεις	Συμβάσεις	Πληρωμές	Πληρ / Συμβ
5001953	Προμήθεια ιατροτεχνολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού Μαιευτικής κλινικής και τμήματος επειγόντων περιστατικών Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ	18/08/2016	426.651			0,0%
10	Πρώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)		4	5.788.763	3.004.601	422.866	14,1%
10.1	Ενεργός ένταξη, με σκοπό, μεταξύ άλλων, της προώθησης της ισότητας των ευκαιριών, και της ενεργού συμμετοχής και της βελτίωσης της απασχολησιμότητας		2	5.339.664	2.845.737	327.547	11,5%
5000006	Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών για άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που βιώνουν ή κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό με στόχο την ένταξη τους ή την παραμονή τους στην αγορά εργασίας	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. Ε.	11/09/2015	2.847.567	2.845.737	327.547	11,5%
5001929	Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών για άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που βιώνουν ή κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό με στόχο την ένταξη τους ή την παραμονή τους στην αγορά εργασίας	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. Ε.	11/08/2016	2.492.097			0,0%
10.2	Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση της ισότητας των ευκαιριών		2	449.100	158.864	95.318	60,0%
5000007	Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με αναπηρία	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. Ε.	11/09/2015	158.864	158.864	95.318	60,0%
5001930	Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με αναπηρία	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. Ε.	11/08/2016	290.236			0,0%
11	Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση		1	49.500.000	19.410.169	0	0,0%
11.1	Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση		1	49.500.000	19.410.169	0	0,0%
5000131	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	22/01/2016	49.500.000	19.410.169		0,0%
12	Τεχνική Βοήθεια (ΕΤΠΑ)		3	1.420.000	0	0	0,0%
12.1	Τεχνική Βοήθεια (ΕΤΠΑ)		3	1.420.000	0	0	0,0%
5001085	Έξοδα μετακινήσεων εσωτερικού - εξωτερικού του ανθρώπινου δυναμικού της ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ περιόδου 2016 - 2020	ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	03/06/2016	340.000			0,0%





ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020

Πίνακας ενταγμένων έργων ανά Άξονα Προτεραιότητας και Επενδυτική Προτεραιότητα

Στοιχεία ΟΠΣ - 30/09/2016

Κωδικός / MIS	Τίτλος	Φορέας	Ημ. Ενταξης Αριθ. Έργων	Εντάξεις	Συμβάσεις	Πληρωμές	Πληρ / Συμβ
5001116	Οργάνωση Εκδηλώσεων – Συνεδριάσεων – Συσκέψεων της ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ	ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	13/07/2016	200.000			0,0%
5001125	Υπηρεσίες Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης της ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ	ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	03/06/2016	880.000			0,0%
ΣΥΝΟΛΟ			18	68.135.950	27.703.258	1.358.660	4,9%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΠΑ			14	62.347.187	24.698.657	935.795	3,8%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤ			4	5.788.763	3.004.601	422.866	14,1%

